



資料2
修正版



東海再処理施設の廃止措置計画

平成30年 9月20日

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
核燃料サイクル工学研究所

目次

1. 廃止措置プロジェクトの全体概要

1.1 東海再処理施設の概要

1.2 廃止措置における安全上の留意事項

1.3 廃止措置の主な方針

1.4 廃止措置の工程

2. 廃止措置に係る安全対策

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策

2.2 施設のリスク低減の取組

2.3 除染・解体に先行着手する施設


2.4 廃止措置に係る管理面での対応

3. おわりに

1. 廃止措置プロジェクトの全体概要


1.1 東海再処理施設の概要

— 施設の位置 —


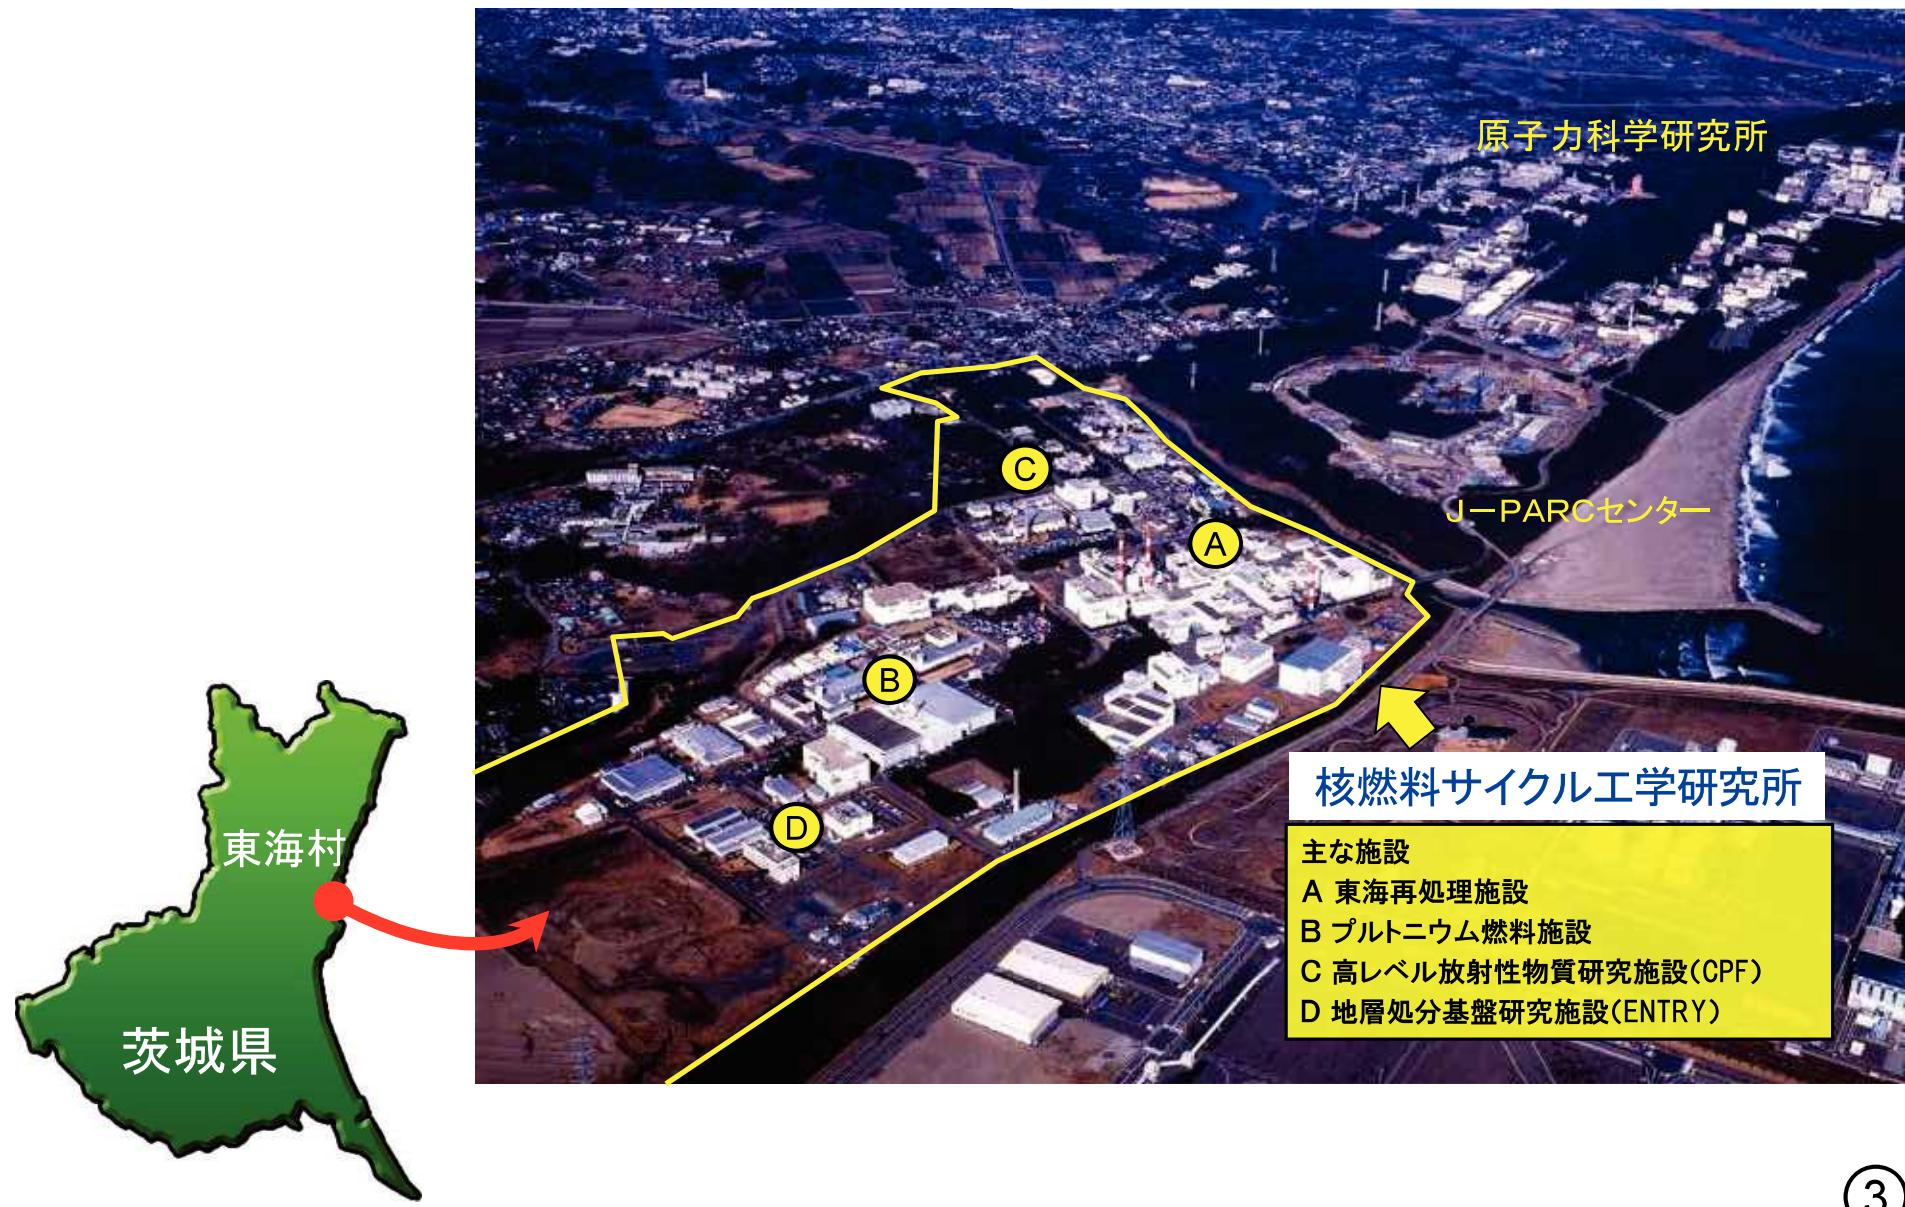


1.1 東海再処理施設の概要


— 工程概要 —

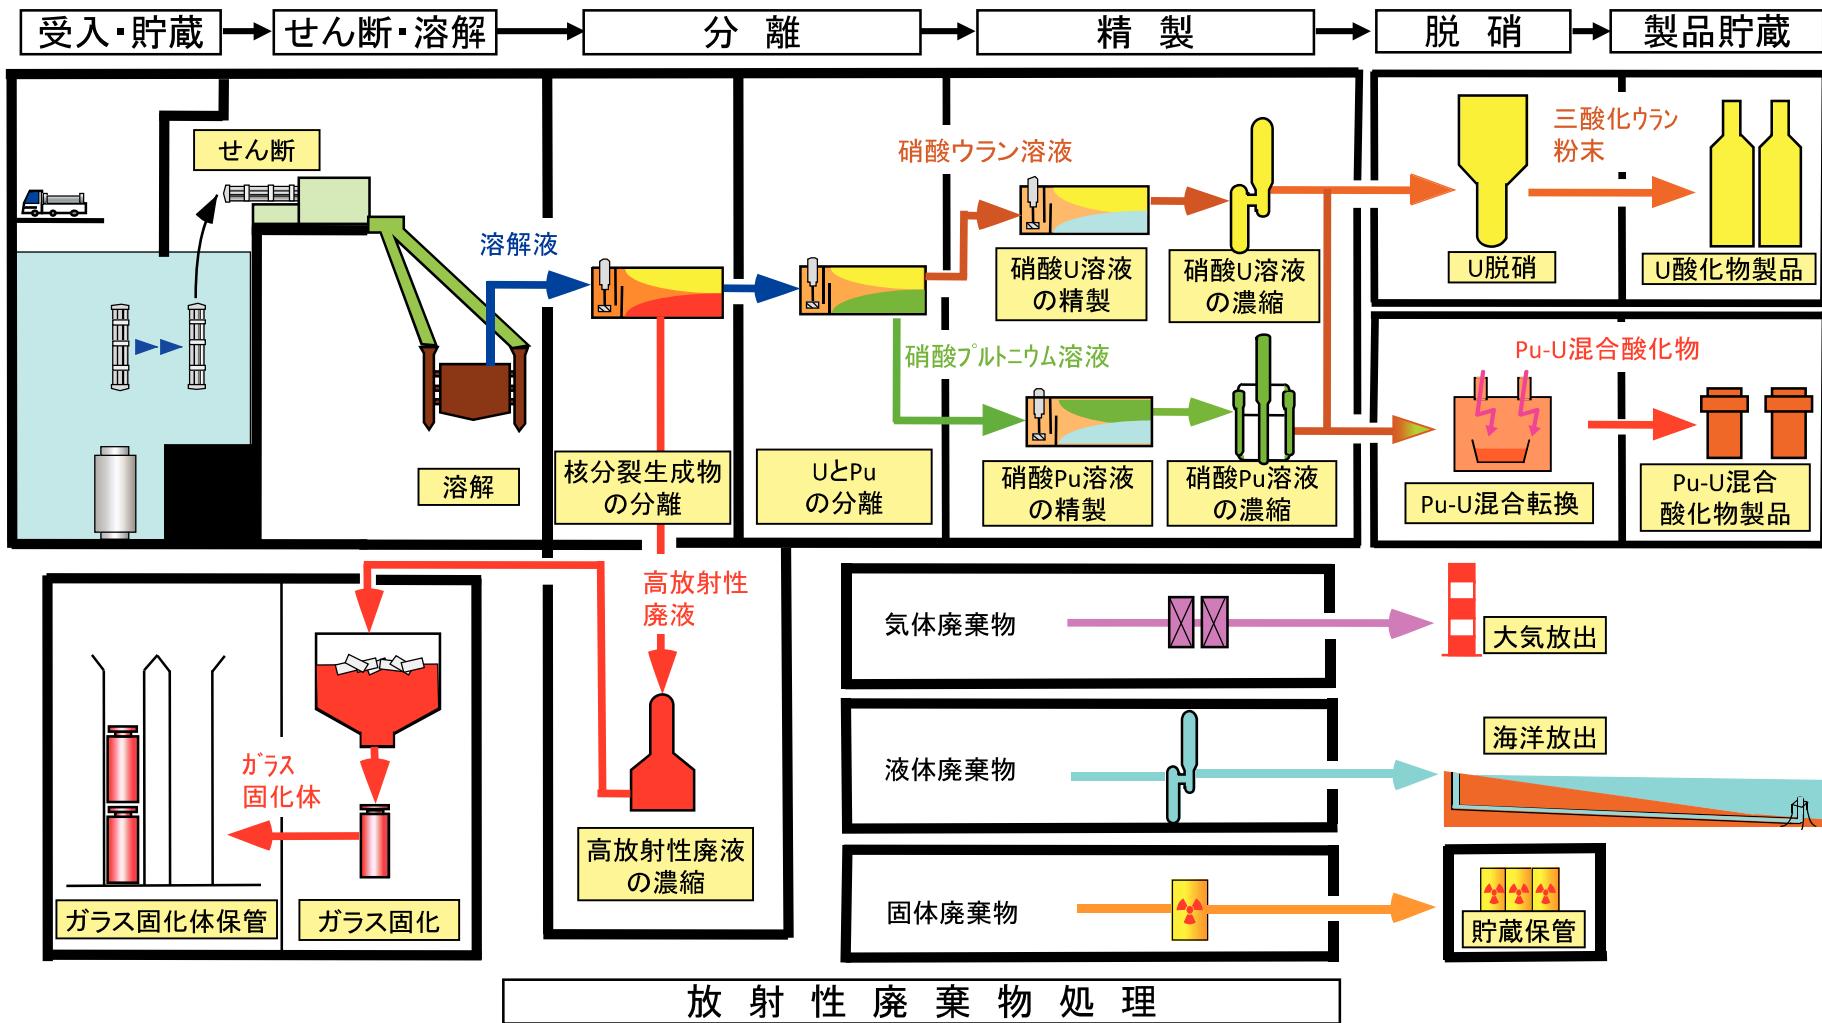

1.2 廃止措置における安全上の留意事項 — 原子力発電所との比較 —

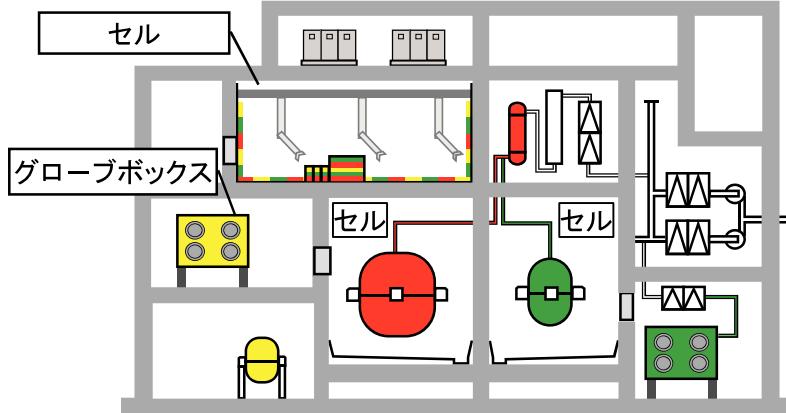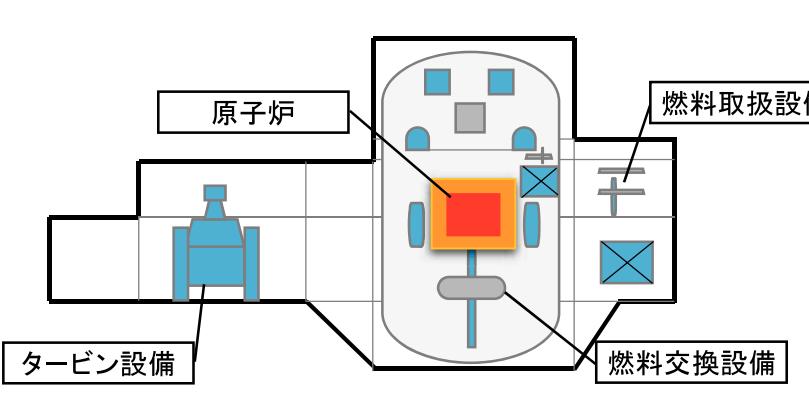再処理施設	原子力発電所
<p>■ : FP/TRU系 (放射線量が比較的高い) ■ : Pu系 (放射線量が比較的低い) ■ : U系 (放射線量が極めて低い)</p>  <ul style="list-style-type: none"> 放射性物質を扱う機器、配管が広範囲に汚染 (放射性物質が付着)。 セル内、グローブボックス内など広い面積が汚染。 核分裂生成物(FP)、長半減期のウラン(U)・プルトニウム(Pu)が混在または分離しており、工程毎に組成が異なる。 	<p>■ : 放射線量が比較的高い (主に放射化) ■ : 放射線量が比較的低い (主に放射化) ■ : 放射線量が極めて低い</p>  <ul style="list-style-type: none"> 大部分の放射性物質は使用済燃料の中に密封 (燃料を取り出せば大幅に減少)。 炉心に放射化物が集中。 大型の機器や配管が多い。 短半減期の放射性核種も存在 (冷却期間を設ける)。

— 東海再処理施設の廃止措置の特徴 —

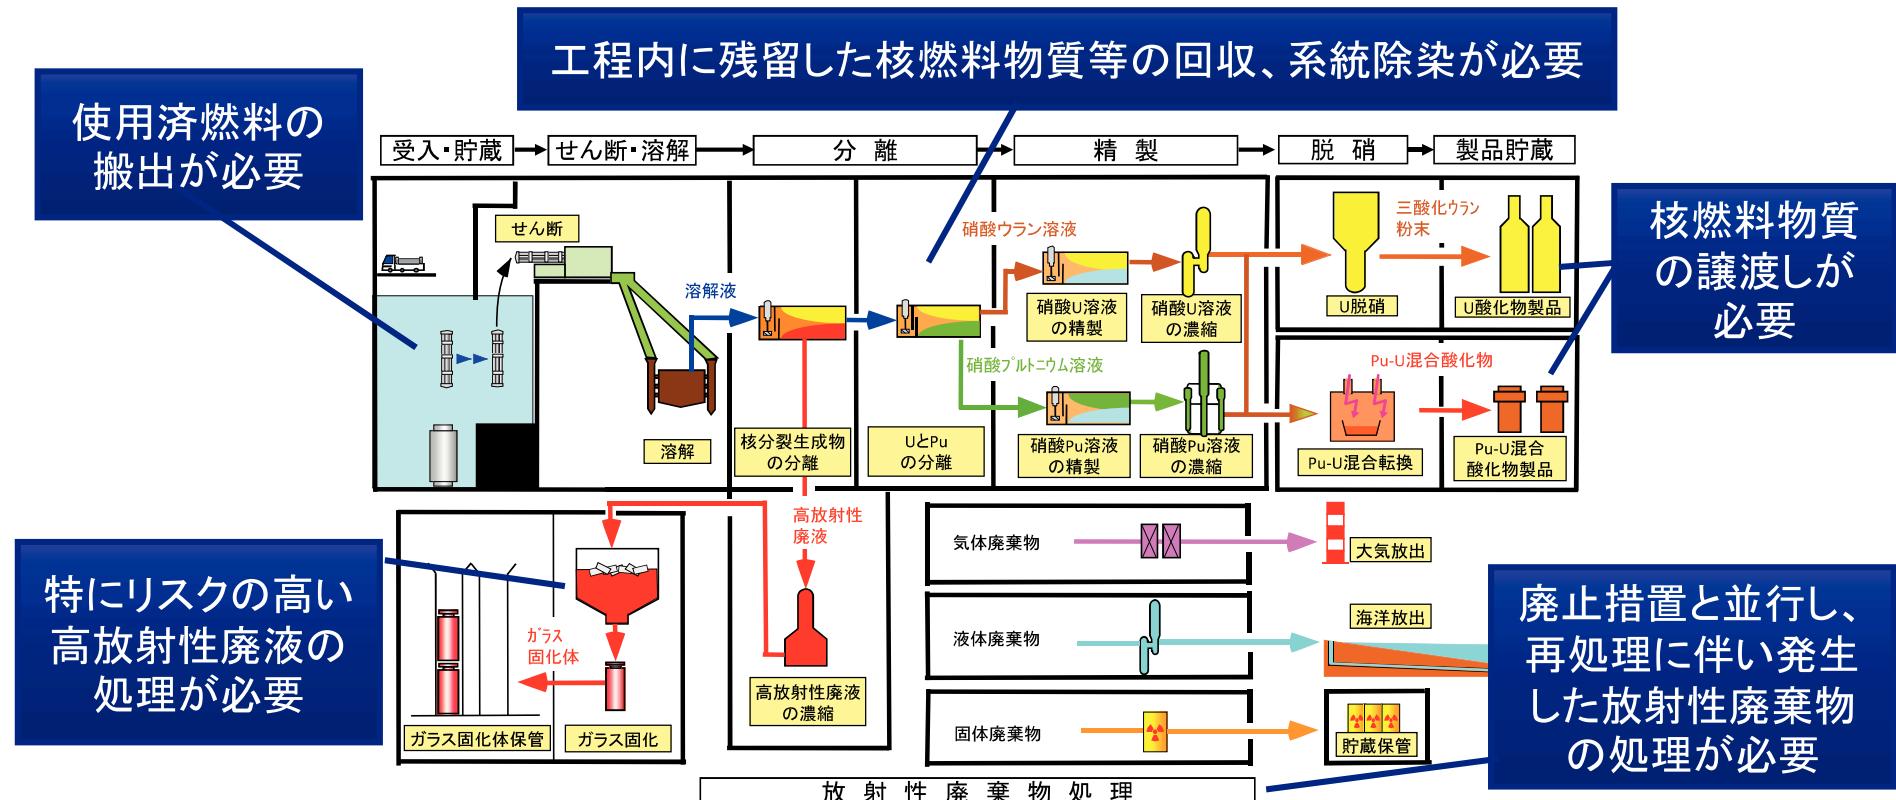

上記の他、

- ・約30の管理区域を有する施設に対して順次廃止措置を進めることが必要
- ・施設の高経年化対策が必要
- ・新規制基準を踏まえた安全性向上対策が必要
- ・機器解体後のスペースを活用し、解体廃棄物の保管が必要

1.3 廃止措置の主な方針 — 主な方針 —

- 廃止措置においては、保有する放射性廃棄物に伴うリスクの早期低減を当面の最優先課題とし、これを安全・確実に進めるため、施設の高経年化対策と新規制基準を踏まえた安全性向上対策を重要事項として実施する。
- 廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵、放射性廃棄物の処理・貯蔵、核燃料物質の保管を継続して行う必要があることから、これらの施設及び緊急安全対策等として整備した設備については性能維持施設とし、再処理運転時と同様に性能を維持する。
- 機器の解体等の廃止措置における安全対策は、過去のトラブル等の経験を十分踏まえた上で、放射性物質の施設内外への漏えい防止及び拡散防止対策、被ばく低減対策並びに事故防止対策を講じる。
- 低レベル放射性廃棄物については、必要な処理を行い、貯蔵の安全を確保するとともに、廃棄体化施設を整備し廃棄体化を進め、処分施設の操業開始後随時搬出する。
- 再処理施設の廃止措置は、施設内に保有する廃棄物の処理を行いつつ所期の目的が終了した建家ごとに段階的に進める。
- 再処理施設の廃止措置は、全期間の全工程について詳細に定めることが困難であることから、今後詳細を定め、逐次廃止措置計画の変更申請を行う。


1.3 廃止措置の主な方針 — リスクの早期低減 —

- 東海再処理施設においては、今後リスクを大幅に増加させる活動である新たな使用済燃料のせん断、溶解等は行わず、廃止措置へ移行している。
- このことから、各施設の今後の使用計画を明確にした上で、施設が保有する放射性物質によるリスクに応じて安全上の重要度を見直す。
- 廃止措置においては、保有する放射性廃棄物に伴うリスクの早期低減を当面の最優先課題とし、これを安全・確実に進めるため、施設の高経年化対策と再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則(再処理維持基準規則)を踏まえた安全性向上対策を重要事項として実施する。
- 具体的に、当面は、リスクを速やかに低減させるため、
 - ①高放射性廃液を貯蔵している高放射性廃液貯蔵場(HAW)の安全確保
 - ②高放射性廃液のガラス固化技術開発施設(TVF)におけるガラス固化
 - ③高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)からの廃棄物取出し/再貯蔵
 - ④低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)における低放射性廃液のセメント固化を最優先で進める。

1.3 廃止措置の主な方針 — 性能維持施設 —

- 廃止措置を安全かつ確実に実施するため、必要な設備を廃止措置の進捗に応じて適切に維持管理する。
- 放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建家及び構築物については、これらの系統及び機器が撤去されるまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮蔽体としての機能を維持管理する。
- 専ら廃止措置の用に供する装置を導入する場合は、安全対策を施した設計とする。
- 再処理施設は、廃止措置期間中においても使用済燃料の貯蔵、放射性廃棄物の処理・貯蔵、核燃料物質の保管を継続して行う必要がある。
- これらの施設については当面の間、再処理運転時と同様に性能を維持する必要があることから、再処理運転時の施設定期自主検査の対象としていた設備及び緊急安全対策等として整備した設備、また、これらを含む系統を性能維持施設とする。
(例)建家及びセル換気系、空気圧縮機、冷水設備用ポンプ、浸水防止扉等
- 廃止措置期間中に性能を維持すべき施設の詳細な設備及び維持すべき期間を明確にした上で、今年度中に廃止措置計画の変更申請を行う。


1.4 廃止措置の工程 — 進め方 —

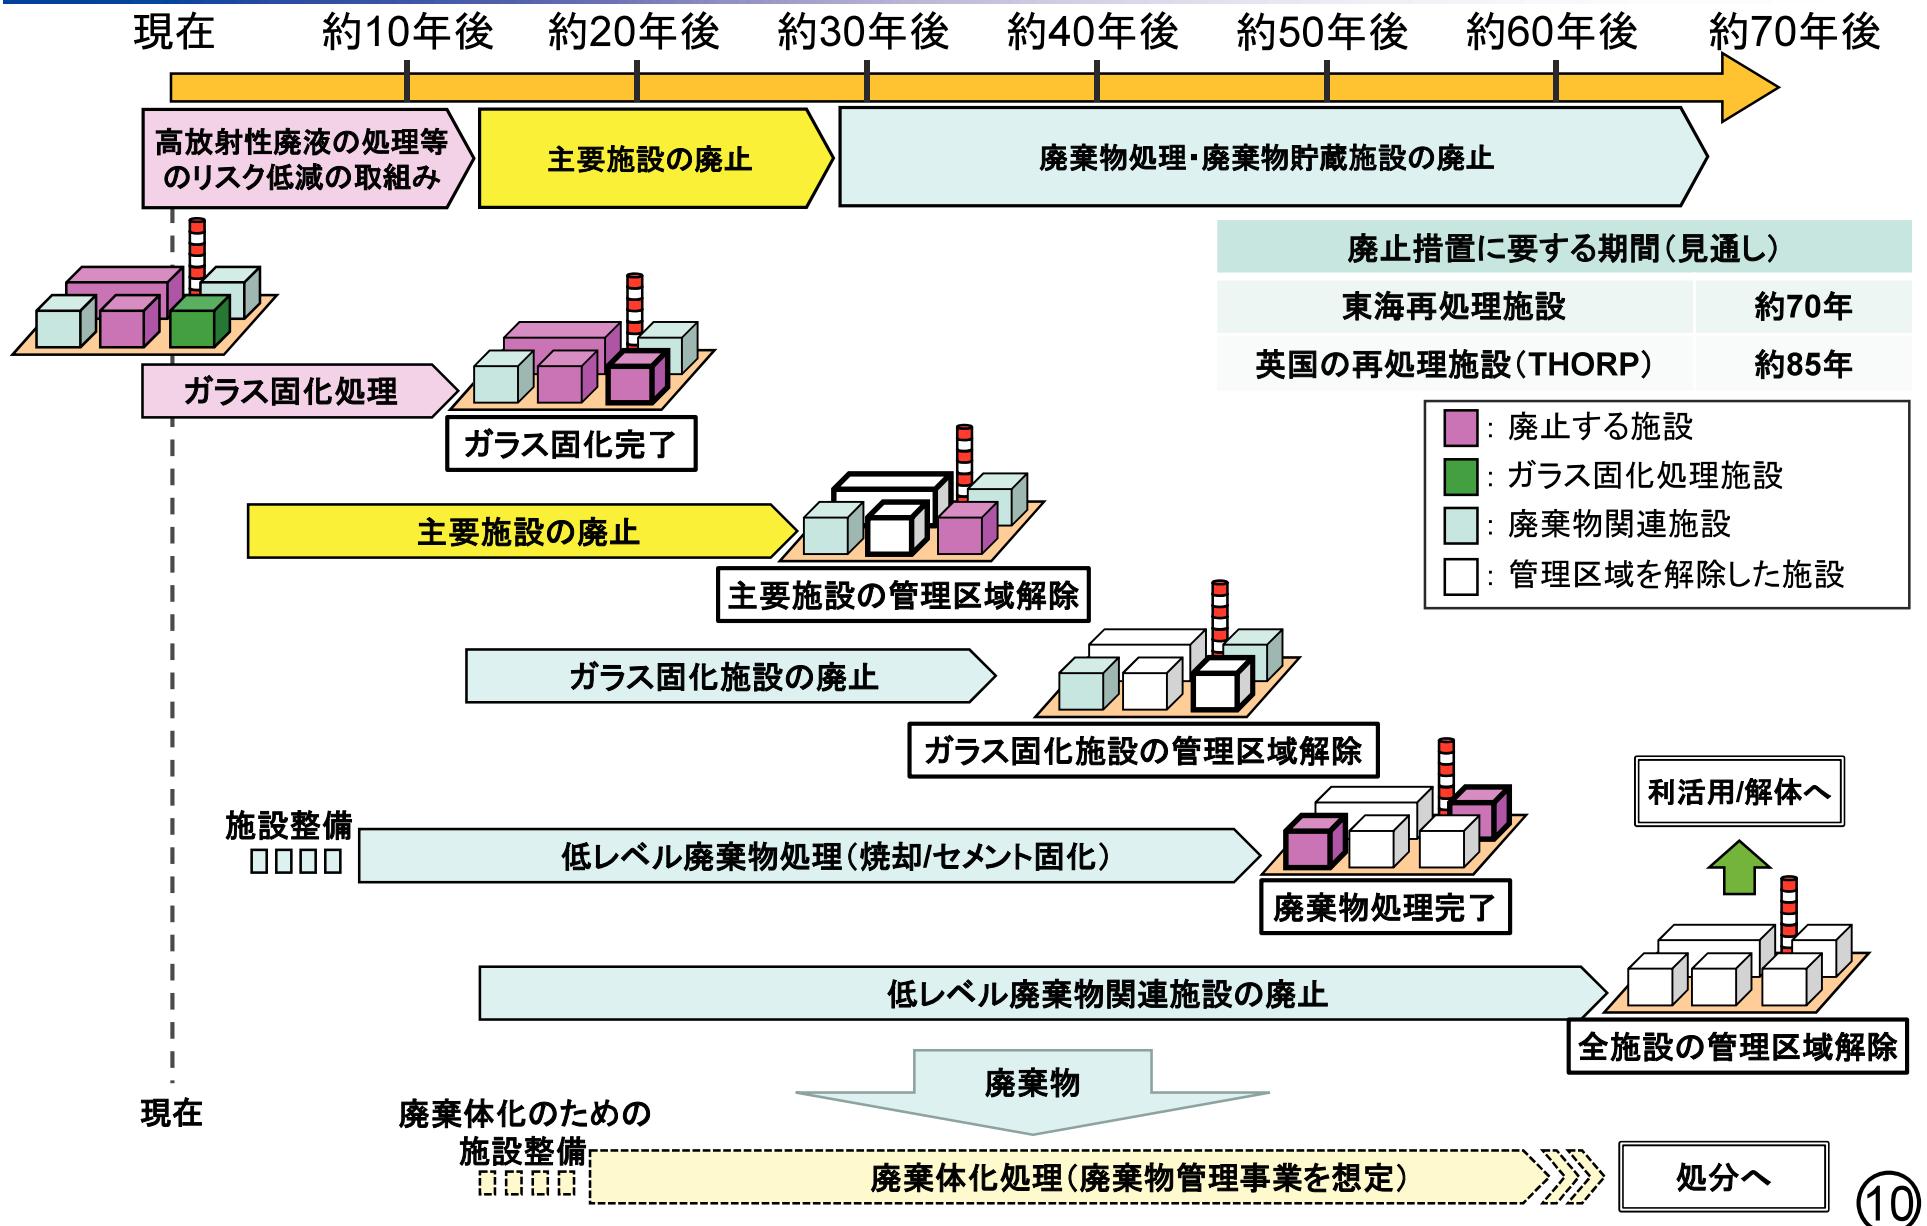

1.4 廃止措置の工程

— 工程 —

- 約70年間の廃止措置計画は、高放射性廃液の処理等のリスク低減の取組み、主要施設の廃止、廃棄物処理・廃棄物貯蔵施設の廃止の順に進める。
- 当面はTVFにおける高放射性廃液のガラス固化、HASWSからの廃棄物取出し/再貯蔵、LWTFにおける低放射性廃液のセメント固化を進める。また、主要施設の廃止に向け、工程洗浄等を実施する。

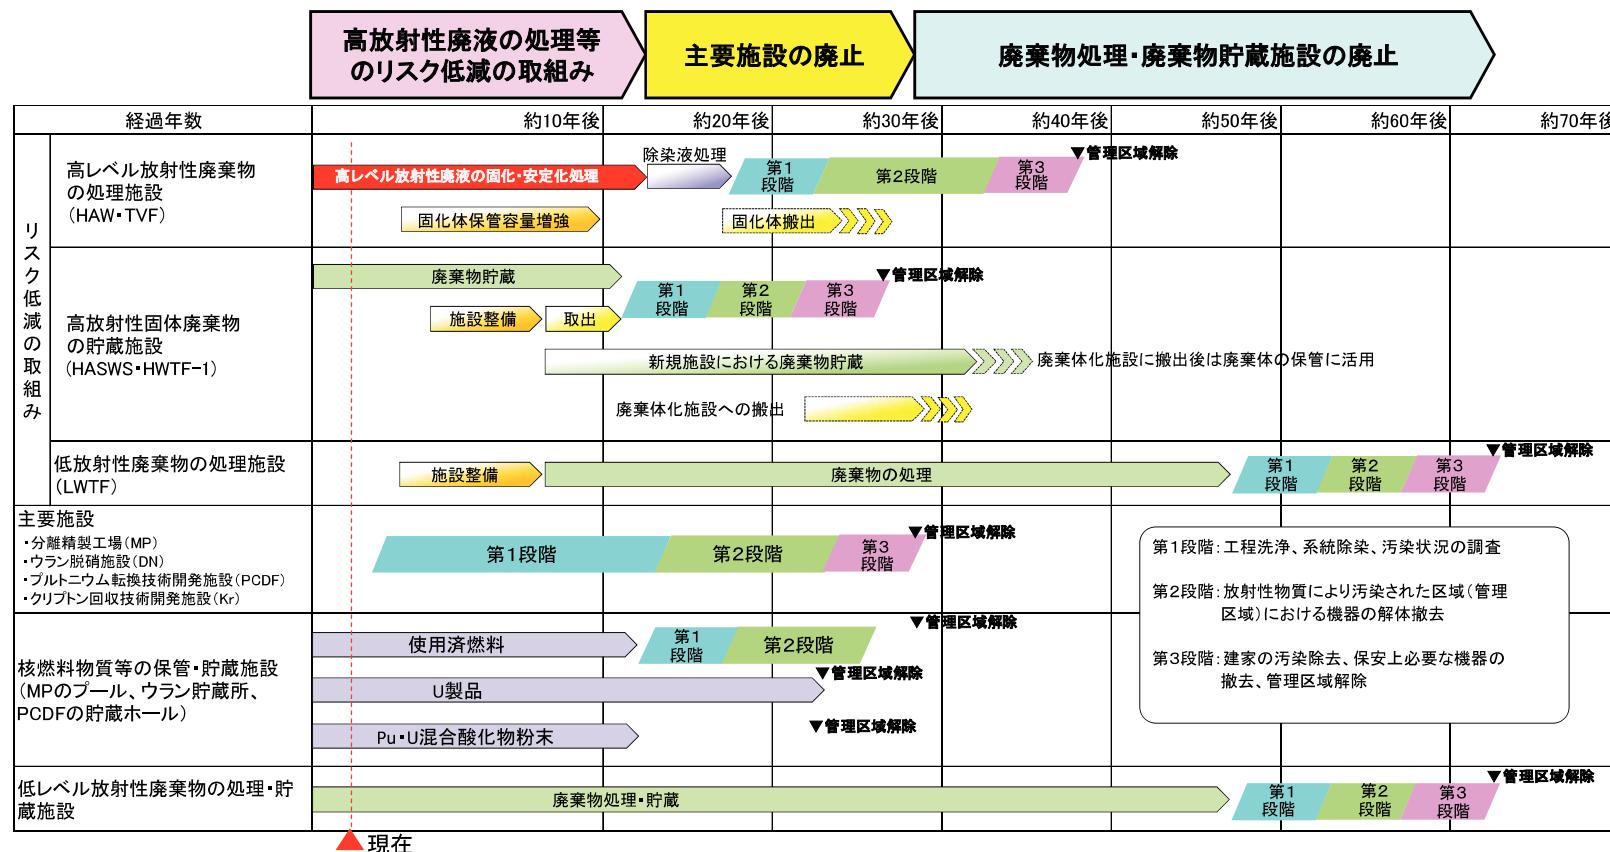

注)ガラス固化体及び廃棄体は、処分施設の操業開始後隨時搬出する計画であり、搬出まで構内の保管施設に保管する。

2. 廃止措置に係る安全対策

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策 — 汚染の拡大防止対策 —

- 气体状の放射性物質に対して、既存の建家・構造物及び換気設備により施設外への漏えい及び拡散防止機能を維持するとともに、この機能が損なわれないように解体の工法及び手順を計画する。
- 汚染のある施設・設備を解体撤去する場合など、必要に応じて汚染拡大防止囲い、局所排気フィルタ及び局所排風機等の施設・設備外への拡散防止機能を持った装置を導入する。また、大洗研究開発センター燃料研究等における汚染事故を踏まえ、事故対策手順を改定しており、汚染事故等が発生した際の産業医や医療機関との連携も含めた迅速かつ的確な対応について、訓練を通じて習熟度を上げていく。
- 液体状の放射性物質が発生する間は、漏えい防止機能を維持するとともに、この機能が損なわれないように解体の工法及び手順を計画する。
- なお、施設外への放射性物質の漏えい及び拡散防止対策に係る管理が適切に行われていることを確認するため、廃止措置時においても再処理施設からの放射性物質の放出管理に係る排気モニタリング、排水モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを継続して実施する。

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策 — 作業員の被ばく低減対策 —

機器解体に当たっては、対象範囲の表面密度、線量率及び空気中の放射性物質濃度を考慮して、下記の措置を講じることにより、合理的に達成可能な限り被ばく低減に努める。

- 外部被ばく低減のため、機器解体の着手前に系統除染を実施する。また、放射能レベルの高い区域で作業を行う場合は、必要に応じて遠隔操作装置、遮蔽等を用いる。
- 対象範囲の汚染状況等については、事前に確認を行い、その結果に基づき、放射性物質の拡散防止対策、被ばく低減対策等の安全対策を講じて解体を行うことにより、環境への放射性物質の放出抑制及び放射線業務従事者の被ばく低減に努める。
- 内部被ばく防止のため、放射性粉じんの発生及び拡散を抑制する工法を採用する。
- 放射能レベルの高い区域で作業を行う場合は、汚染拡大防止囲い、局所排気フィルタ及び局所排風機を設置するなどにより施設内の汚染拡大防止を図るとともに、マスク等の防護具等を用いる。
- 作業の実施に当たっては、必要に応じて目標線量を設定し、実績線量と比較し改善策を検討するなどして、被ばく低減に努める。
- また、作業区域内の放射線環境に応じてサーベイメータ等により線量率を測定するとともに、線量率が著しく変動するおそれのある作業は、可搬式エリアモニタ装置等を用いて作業中の線量率を監視する。
- 放射能レベルの比較的高い汚染物を取り扱う遠隔操作装置等の導入に当たっては、放射線業務従事者の被ばく低減を考慮して、作業区域内の空間線量率に応じて適切に遮蔽を行う。

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策 —周辺公衆の被ばく低減対策—

- 廃止措置段階における放射性廃棄物の放出管理に当たっては、放射性物質に起因する被ばく線量を低くするための措置を合理的に、かつ、可能な限り講ずる観点から、廃止措置計画に放出の基準を定め、廃止措置の進捗に応じて、適宜、これを見直す。放出の基準は、まずは工程洗浄が終了した段階に定め、廃止措置計画の変更を行う。
- 一方、放出の基準を定める間の当面の放出管理として、クリプトン-85(⁸⁵Kr)、トリチウム(³H)については、これまでの放出実績等から放出管理目標値を定め、これを保安規定にて管理する。また、工程洗浄に係る廃止措置計画の変更時においても工程洗浄に伴う放出管理目標値を定め、これを保安規定にて管理する。
- 設定した放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理目標値は、現行の保安規定に定める値の約1/50である。

放射性気体廃棄物の放出の基準

(主排気筒、第一付属排気筒及び第二付属排気筒の合計)

核種	1年間の最大放出量	1年間の放出管理目標値
⁸⁵ Kr	8.9×10^{16} Bq	2.0×10^{15} Bq
³ H	5.6×10^{14} Bq	1.0×10^{13} Bq

約1/50

放射性液体廃棄物の放出の基準

(海洋に放出する処理済廃液)

核種	1年間の最大放出量	1年間の放出管理目標値
³ H	1.9×10^{15} Bq	約1/50 4.0×10^{13} Bq

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策 — 事故防止対策 —

- 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障による人的災害、又は周辺公衆への影響を防止するため、事前に作業における危険性等を調査し、必要な安全対策を講じる。
- 遠隔操作装置等の導入に当たっては、汚染物の落下防止対策及び衝突防止対策を講じる。
- 地震、台風等の自然事象に備え、内包する有意な汚染を除去するまで既存の建家を維持する。
- 火災等の人為事象に対する安全対策として、既存の消火設備等を維持するとともに難燃性の資機材の使用、可燃性物質の保管及び可燃性ガスを使用する場合の管理の徹底、重量物に適合した揚重装置の使用等の措置を講じる。
- 事故発生時には、事故拡大防止等の措置を講じるとともに、早期の復旧に努める。

2.1 廃止措置作業に係る基本的な安全対策 — 放射性廃棄物の処理・処分 —

放射性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減するように努めるとともに、発生した放射性廃棄物を適切に処理する。

➤ 放射性気体廃棄物

放射性気体廃棄物は、洗浄塔、フィルタ等で洗浄、ろ過したのち、排気筒を通じて大気に放出する。放出に当たっては、排気筒において放射性物質濃度を常時測定監視し、保安規定の値を超えないように管理する。

➤ 放射性液体廃棄物

放射性液体廃棄物は、放射能レベルの区分や性状に応じて蒸発処理、中和処理及び油分除去を行い、海中放出設備の放出管を通じて海中に放出する。放出に当たっては、放射性液体廃棄物の放出量が保安規定の値を超えないように管理する。

➤ 放射性固体廃棄物

放射性固体廃棄物のうち可燃性廃棄物及び難燃性廃棄物は、焼却したのち放射性廃棄物の貯蔵施設に貯蔵する。不燃性廃棄物は、放射能レベルの区分や性状に応じて放射性廃棄物の貯蔵施設に貯蔵する。

これらの廃棄物は、廃棄体化施設の整備が整い次第廃棄体化施設に搬出し、処分施設の要件に見合うよう廃棄体化処理する。廃棄体は処分施設の操業開始後隨時搬出する。

なお、最終処分は、バックエンド対策にとって必要不可欠であり、早期に処分が可能となるよう立地推進等の所要の取り組みを継続する所存である。最終処分の開始がやむを得ず遅れる場合は、各施設及び廃棄物の安全な管理が損なわれないよう廃止措置や廃棄物処理・保管の計画の調整により対応を図っていく。

2. 廃止措置に係る安全対策

2.2 施設のリスク低減の取組


2.2 施設のリスク低減の取組

— リスク低減の取組を実施する施設の選定の考え方(1/3) —

東海再処理施設の廃止措置においては、安全対策の実施とともに、保有する放射性廃棄物に伴うリスクの早期低減を当面の最優先課題とする。

- 再処理に伴い発生した特にリスクの高い高放射性廃液を貯蔵(HAW、TVF)
- 高放射性固体廃棄物を取出しきれない状態でプールやセルに貯蔵(HASWS)
- 再処理に伴い発生した大量の低放射性廃液を貯蔵(LWTF)

高放射性廃液貯蔵の安全性向上

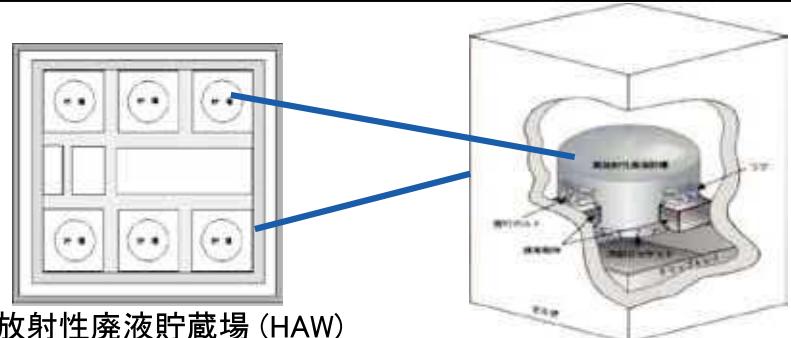

高放射性廃液貯蔵場 (HAW)

高放射性廃液のガラス固化



ガラス固化技術開発施設 (TVF)



溶融ガラス流下


高放射性固体廃棄物の取出し/再貯蔵



高放射性固体廃棄物缶
高放射性廃棄物貯蔵庫 (HASWS)



低放射性廃液のセメント固化

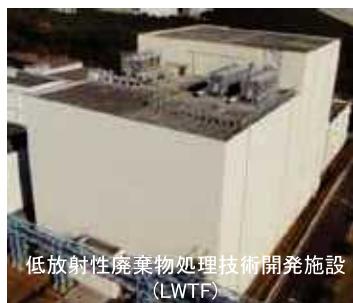

低放射性廃棄物処理技術開発施設
(LWTF)



蒸発缶




核種分離工程

2.2 施設のリスク低減の取組

— リスク低減の取組を実施する施設の選定の考え方(2/3) —

- 高放射性廃液の貯蔵では、全交流電源喪失時に沸騰、水素爆発が生じるリスクに対し、冷却、水素掃気に係る安全対策が必要である。

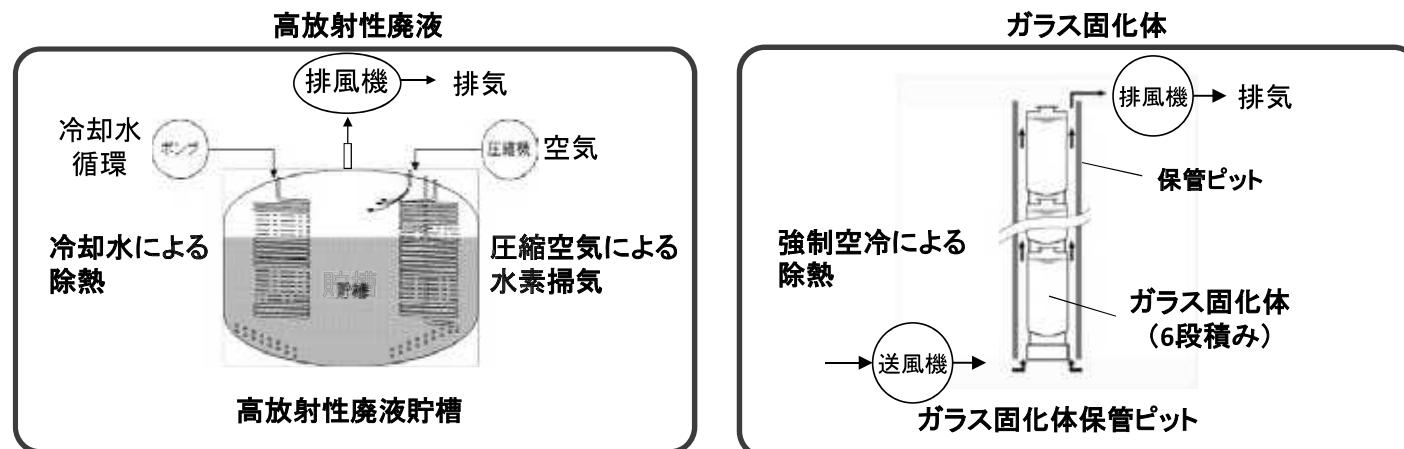

性状	高放射性廃液		ガラス固化体	
安全機能	冷却	水素掃氣	冷却	水素掃氣
通常時	冷却水循環	圧縮空気供給、排風機による換気	強制空冷	不要
全交流電源喪失時の対策	電源車による給電、ポンプ車による給水で冷却維持	電源車による給電、圧縮機による掃気ガス供給 電源車による給電、排風機による掃気ガス換気	不要* 保管ピットで自然冷却	不要



* 強制空冷停止によりガラス固化体は温度上昇するが、安全上の問題は生じない。

対策が機能しなかった場合の影響	沸騰に伴う放射性物質の放出のおそれ	水素爆発に伴う放射性物質の放出のおそれ	なし	なし
-----------------	-------------------	---------------------	----	----

— リスク低減の取組を実施する施設の選定の考え方(3/3) —

- 早期のガラス固化により、**安全機能維持(冷却、水素掃気、閉じ込め、保管管理)**に必要な設備数が減少、耐震性の高い保管ピットでの保管が可能。

比較項目	高放射性廃液の貯蔵	ガラス固化体の保管
冷却 (沸騰防止)	・冷却水設備、電源供給設備による貯槽の冷却を実施。	・強制冷却機能喪失時においても自然通風により、ガラス固化体は冷却される。
水素掃気 (爆発防止)	・掃気用設備、換気設備、電源供給設備、排気経路維持による貯槽の水素掃気を実施。	・固体状態であり、水の放射線分解に伴う水素濃度上昇はなく水素掃気は不要。
閉じ込め (漏えい)	・槽類換気設備によって貯槽を負圧に維持して閉じ込めを確保。 ・貯槽内は、硝酸による腐食環境。 ・漏えいに備え、ドリップトレイ及び検知・回収設備を設置。	・ガラス固化体容器による密閉。また、ガラス固化体容器は、17m落下に耐える設計。 ・ガラス固化体の保管であり、腐食環境でない。
保管管理	多数の設備、機器が必要であり、機器故障や誤操作による不具合発生の可能性がある。	・機器故障や誤操作により、強制冷却機能が喪失しても、自然通風によりガラス固化体は冷却される。

① HAW施設の概要

【施設の役割】

- 高放射性廃液貯蔵場(HAW)は、分離精製工場の高放射性廃液蒸発缶により蒸発濃縮した高放射性の廃液を受け入れ、高放射性廃液貯蔵セル内の貯槽に貯蔵する施設

【施設の概要】

〔主な沿革〕



- 昭和61年3月 竣工
- 昭和61年10月 使用前検査合格

〔主要設備〕

- 高放射性廃液貯槽
 - ・ 設置基數: 6基(うち予備1基)
 - ・ 容量: 約120m³/基

〔主な管理方法〕

- 高放射性廃液: 液位、冷却温度、水素掃気用空気流量、負圧、漏えい検知

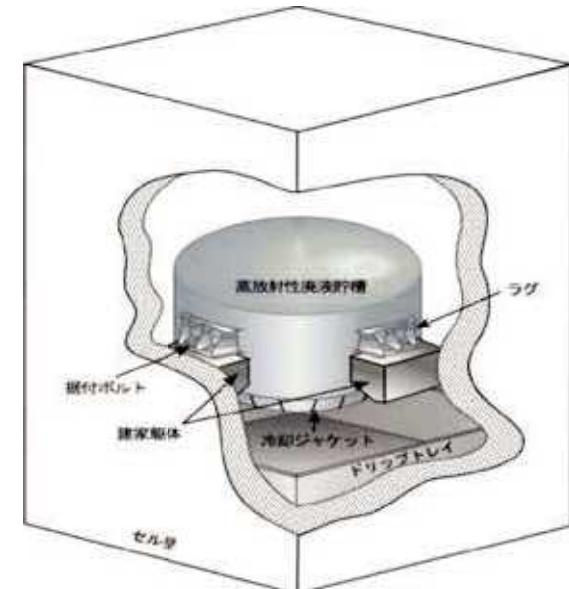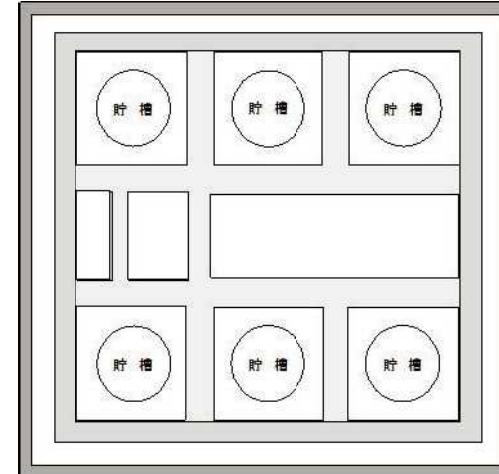

- 高放射性廃液の受入れ・貯蔵及びガラス固化技術開発施設(TVF)への移送を行うため、施設を継続して使用しており、換気による負圧バランスを確保した上で、放射性物質の施設外への漏えい防止機能及び放射線遮蔽機能を維持することが必要。

✓ 高放射性廃液貯蔵場(HAW)に係るリスク評価

- HAW施設の建家は、暫定基準地震動Ss880ガルに対するスケルトンカーブ(せん断力-せん断ひずみ)により、各階に十分な余裕があることを確認。
- HAW貯槽は、最大容量(約120m³)の貯蔵状態においても、暫定基準地震動Ss880ガルの詳細解析により、最も裕度(許容応力と発生応力の比)の小さい据付ボルトのせん断応力の裕度は約1.6倍を確保。
- 暫定津波シミュレーションにおいて、HAW施設はT.P.+12.8mまで浸水するが、津波防止対策を実施したT.P.+14.4mに比べ低い。
- 建家内部が浸水した場合でも、電源系統は、上層階に設置しており、影響はない。地下のHAW貯槽を設置しているセルは浸水することが考えられるが、浮力発生によるHAW貯槽への影響はない。

③ 現状及び今後の安全対策(1/4)

- 高放射性廃液貯槽は、崩壊熱除去機能及び水の放射線分解により発生する水素の掃気機能を有しており、停電時には非常用発電機からの給電により機能を維持する。
- 平成33年度終了を目指し新規制基準を踏まえた安全性向上対策を進める。

【事故対策】沸騰の防止等

- 電源車等を配備済
- 可搬型蒸気供給設備を配備済
- 重要な電源の予備ケーブルを配備済




可搬型蒸気供給設備
(本設設備が使用できない場合の漏えい液移送用蒸気設備)



【自然災害対策】

- 地震: 建家は十分堅牢、地盤補強を検討中
- 津波: 浸水防止扉を設置済、外壁補強を検討中
- 竜巻: 建家開口部の竜巻飛来物防護を検討中

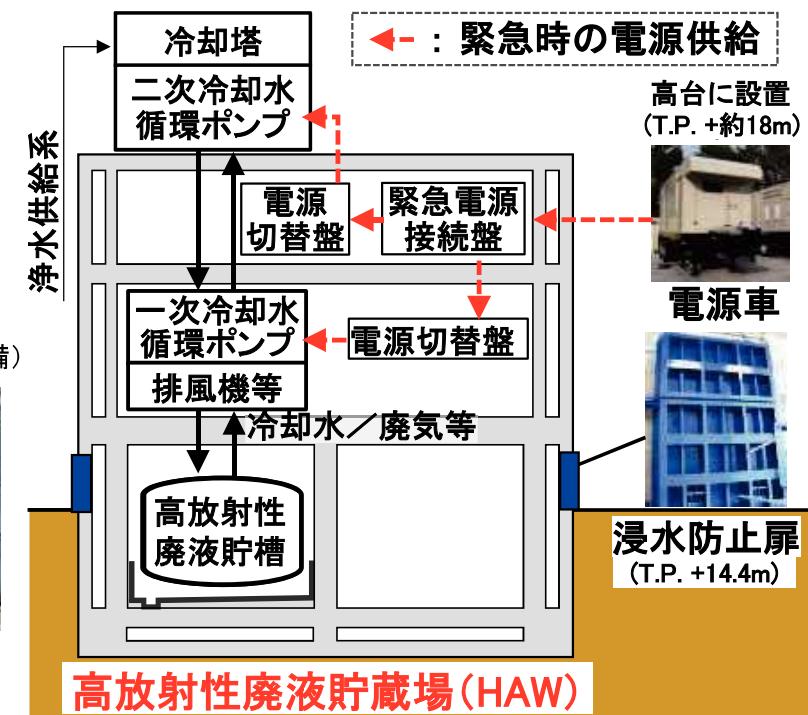

③ 現状及び今後の安全対策(2/4)


HAW施設における高経年化に係る点検整備を行い、高放射性廃液の長期貯蔵の維持管理に必要な機器類の点検保守を計画的に実施している。



②日常点検(エア流量の確認)



③月例点検(冷却水ポンプ)

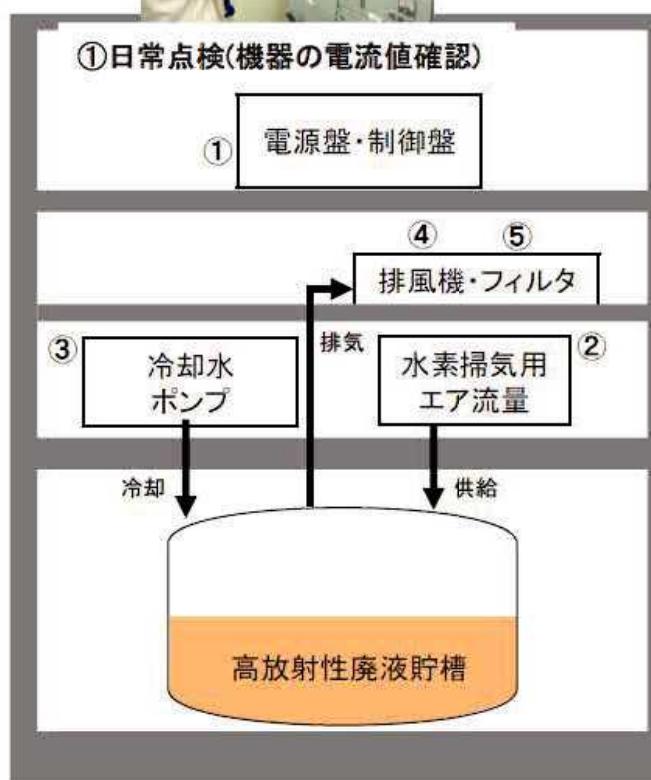

点検場所のイメージ




④点検保守(排風機のベルト交換)



⑤点検保守(フィルタ交換)

③ 現状及び今後の安全対策(3/4)

高経年化対策として、HAW貯槽セル内の観察方法の拡充に向けて、以下の取り組みを実施。

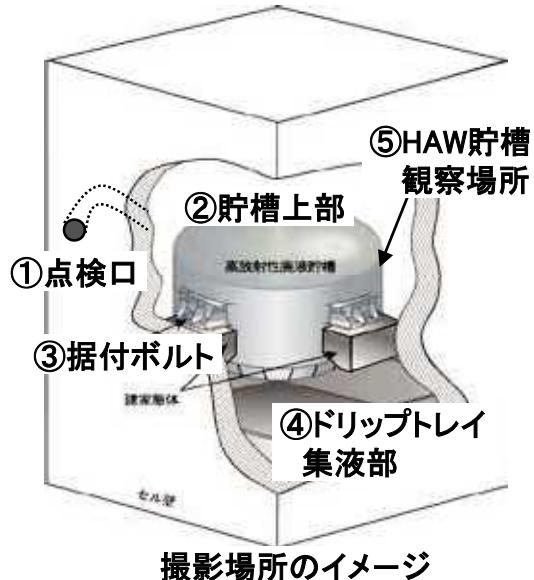

◆ 予備貯槽セル内の観察

HAWを貯蔵していない予備貯槽において、貯槽上部の配管接続部の状態、据付ボルトの状態(ボルトの脱落の有無等)、万一の溶液漏洩時のドリップトレイ集液部の状態等が観察できることを確認。



◆ HAW貯槽の観察

HAWセル内は高線量である為、映像が乱れてしまう。
今後のカメラや画像処理の改良に資するため、
セル内の線量率測定を実施した。




◆ 今後の取組み

高線量な環境であっても鮮明な画像が得られる
カメラの調査と画像処理の方法を検討する。
HAW貯槽の状態を直接観察できることによる、
健全性確認方法の充実に取り組んでいく。

③ 現状及び今後の安全対策(4/4)

HAW施設からTVFへの高放射性廃液の移送前(TVF運転再開前)に、実施した点検、教育・訓練のうち主要な事項を示す。

- 保安規定に基づく施設定期自主検査及び自主検査の確実な実施
- ベテラン視点における追加点検
 - ①冷却水系配管、排気系配管、蒸気系配管等の肉厚測定を実施。
⇒ 減肉のないことを確認。
 - ②遠隔操作弁の作動確認等を実施。
⇒ 開閉操作に問題のないことを確認。
 - ③実際のHAW移送の際にHAW貯槽や送液配管からの微小漏えいも検知できるように予めドリップトレイ集液部に水を張り、液位監視用記録計を設置し、その液位を送液の都度監視(図1)。
⇒ 送液に伴う液位上昇のないことを確認。
- 教育・訓練の実施
 - ・ TVFへのHAW送液操作の操作訓練を繰り返し行い、運転操作手順書に反映し、その都度、教育を実施した。
 - ・ 過去のトラブル事例教育

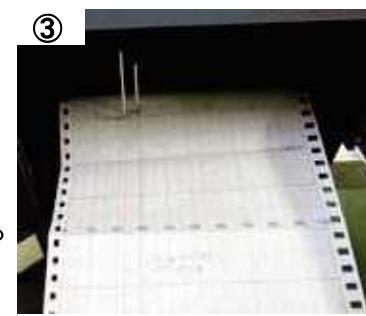

漏えいなしを確認

ドリップトレイ集液部
(漏えい検知装置:LA+設置)

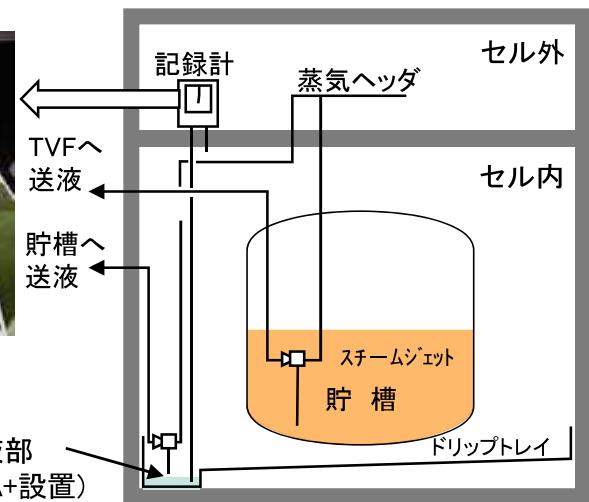


図1 微小漏えい監視概要図

① TVF施設の概要

【施設の役割】

- 再処理施設から発生した高放射性廃液を受入れ、ガラス原料と共に溶融炉にてガラス溶融を行い、溶融したガラスをステンレス鋼製の容器に注入しガラス固化体として保管セルで保管する施設

【施設の概要】

〔主な沿革〕

- 平成4年4月 竣工
- 平成7年12月 使用前検査合格

〔主要設備〕

- ガラス溶融炉
 - 溶融温度: 1100～1200 °C(最大1250 °C)
 - 溶融方式: 液体供給式直接通電型セラミックメルタ方式
 - 処理能力: 0.35m³/日
- 遠隔補修装置(両腕型マニピレータ): 2基
- ガラス固化体保管セル: 容量420本



ガラス溶融炉

▼ガラス流下の様子



▼ガラス固化体(模型)



ガラス固化体仕様

内 容 物	ホウケイ酸ガラス
ガラス固化体重量	約400kg
ガラス固化体体積	約110ℓ

ガラス固化体容器

形 状	円筒タテ型
外 径 / 全 高	43cm/104cm

② TVF施設のリスク


- TVFでは、使用済燃料の再処理で発生した高放射性廃液を溶融炉でガラス固化するため、施設を継続して使用しており、換気による負圧バランスを確保した上で、放射性物質の施設外への漏えい防止機能及び放射線遮蔽機能を維持することが必要。
- 高放射性廃液によるハザードを早期に低減するため、ガラス固化体の保管能力の増強等を考慮しつつ、12.5年(平成28年8月を起点)でガラス固化を完了することとしている。

✓ ガラス固化技術開発施設(TVF)に係るリスク評価

- TVF開発棟において、高放射性廃液を保有する機器・配管系、それを内包するセル、建家は、これまでに実施した暫定基準地震動(Ss880ガル)に基づく評価から十分な安全裕度を有しており、安全機能を確保できる見通しである。
- 上記施設への蒸気及び水の供給設備並びに非常用給電設備については、耐震補強対策をしなくても安全機能を確保できるよう可搬型蒸気供給設備、可搬型給水設備及び可搬型発電機を配備。

③これまでの不具合及び対処方針(1/2)


- 平成28年及び平成29年のガラス固化処理において発生した不具合では、これまで故障実績のない事象に対し、計画の遅延を最小限にするための速やかな対応が図れていなかった。
- また、復旧に要する期間等を踏まえて対象範囲を限定していたため、固化処理計画を着実に進めるための交換部品や予備品が確保されていなかった。

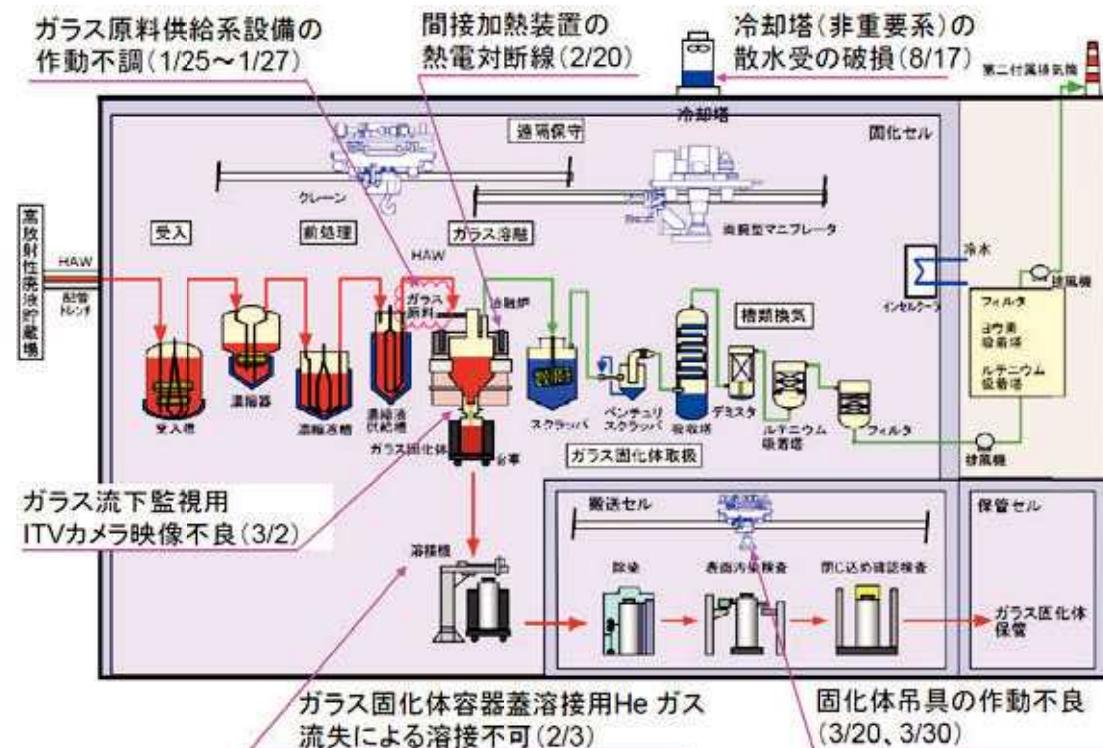

ガラス固化技術開発施設(TVF)で発生した不具合の例(平成28年)

③これまでの不具合及び対処方針(2/2)

- ガラス固化処理を着実に進めるという観点で、全ての工程に対し、今まで故障なく作動している設備機器の故障や時間を要する機器の復旧も想定し、確保しておく予備品及びその管理方法を見直し、計画的に予備品を確保する。
- 状態監視等により異常兆候を早期に検知しており、この取組みを継続する。異常の兆候が確認された場合は、故障前にバックアップ対策で確保した予備品等へ交換する。

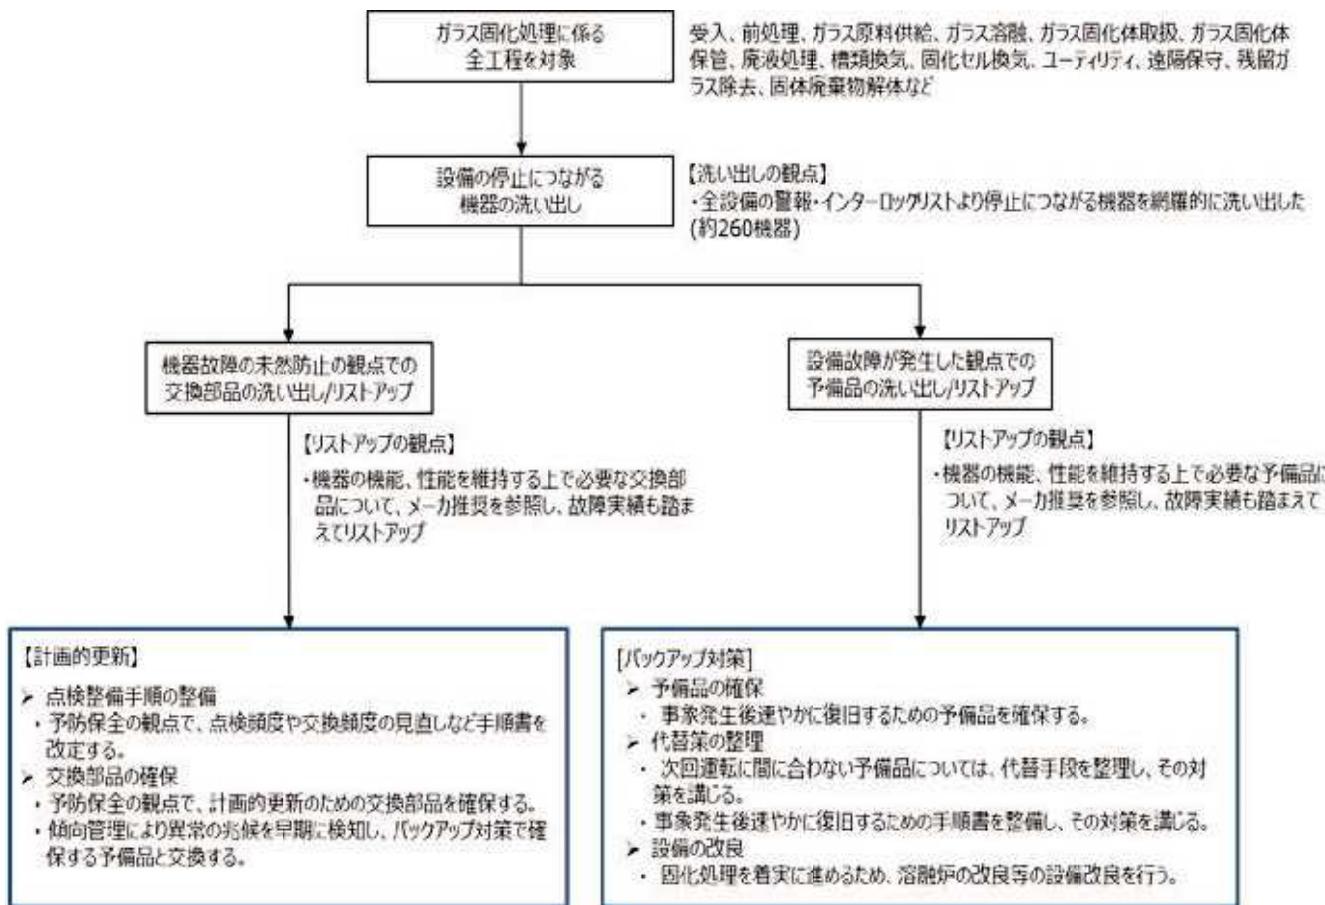

③ 現状及び今後の安全対策(1/3)

➤ 安全性向上に係る訓練

✓ グリーンハウス設置及び除染訓練

大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染事故を踏まえ、TVFにおいて汚染事故等が発生した際の迅速かつ的確な対応を習得する。



図 グリーンハウス設置及び除染訓練風景



✓ ケーブル敷設等訓練

2系統の安全系ケーブルが同時に影響を受け安全機能が喪失した事象を想定した初動対応訓練を実施した。



図 ケーブル敷設及び初期消火訓練風景



➤遠隔作業員の訓練(力量、スキルの維持向上)

模擬構造体を用いたコールドモックアップによるトレーニングを行い、操作手順、不具合防止のホールドポイントの確認をはじめ、溶融炉内での装置感覚や装置の位置とITVカメラ映像の確認など遠隔操作に必要となるスキルの向上を図る。


(今年度実施中)




図 模擬構造体外観

③ 現状及び今後の安全対策(2/3)

- 高経年化対策として、設備機器(両腕型マニピレータ(BSM)及び固化セルクレーン)の計画的更新により遅延リスクを低減。
- 設備の停止につながる機器(ITVカメラ等)について、故障の未然防止及び故障発生後の早期復旧の観点から、交換部品及び予備品をリストアップし、速やかに対応ができるように在庫等を確保。
- 計画的に停止期間を設け、溶融炉や遠隔保守設備を整備。
- 運転体制を強化し、連続運転期間の延長、停止中の整備作業を効率化。

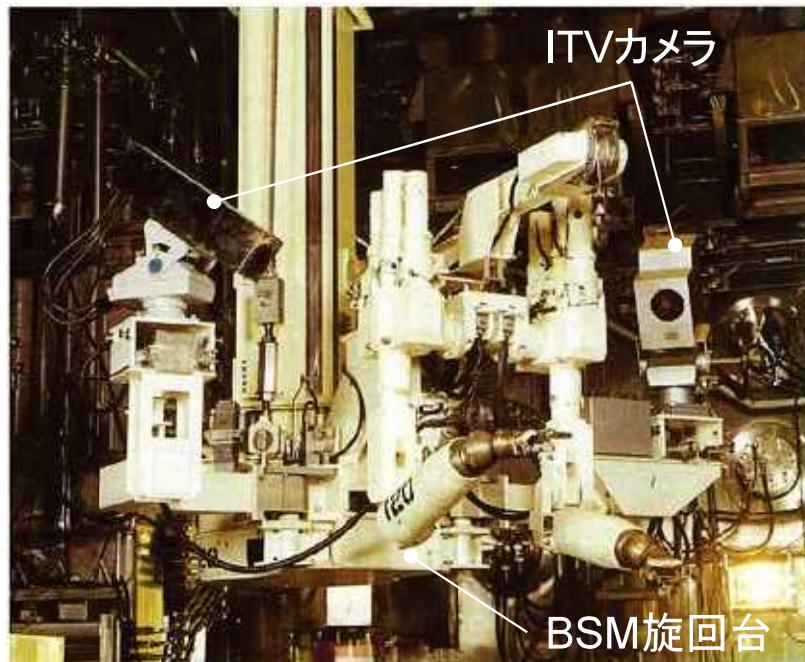

両腕型マニピレータ(BSM)

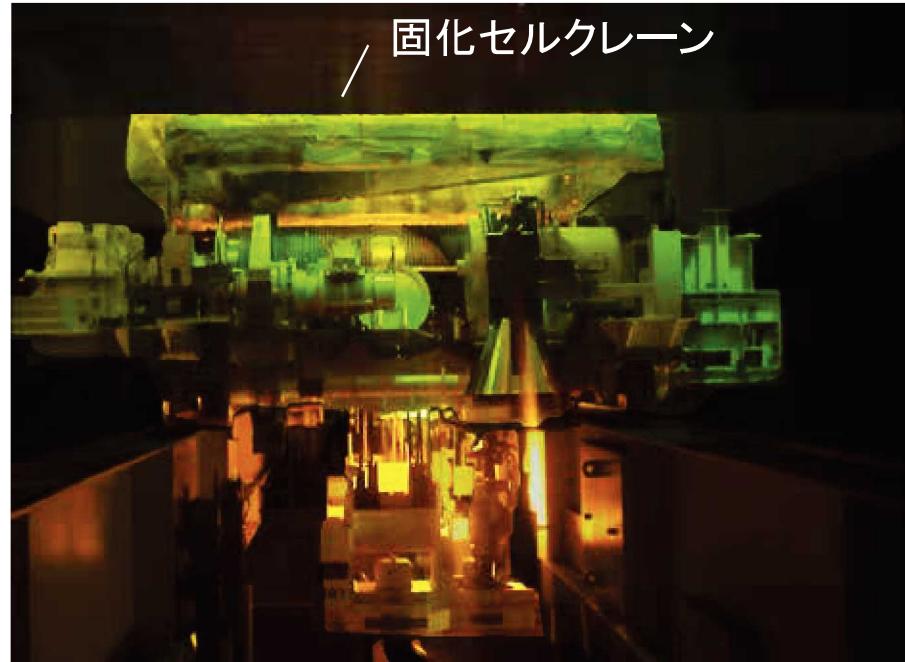


固化セルクレーン


③ 現状及び今後の安全対策(3/3)

ガラス固化処理を着実に進めるため、今後、自治体の了解を得た後、以下に係る廃止措置計画の変更申請を行う計画である。

- ・ガラス固化体は原子力発電環境整備機構(NUMO)が建設する最終処分施設に搬出する計画であり、搬出まで保管施設にて保管する。
- ・ガラス固化処理に伴い、ガラス固化体の保管本数が既許可の420本(70ピット×6段積)に達する予定であることから、設計上の保管スペースを有する630本(70ピット×9段積)まで、**ガラス固化体の保管能力を増強**する。
- ・ガラスが炉内に残留しにくいよう、炉底形状を円錐45度に変更し、**炉底部への白金族元素の堆積を抑制**する3号溶融炉への更新を行う。

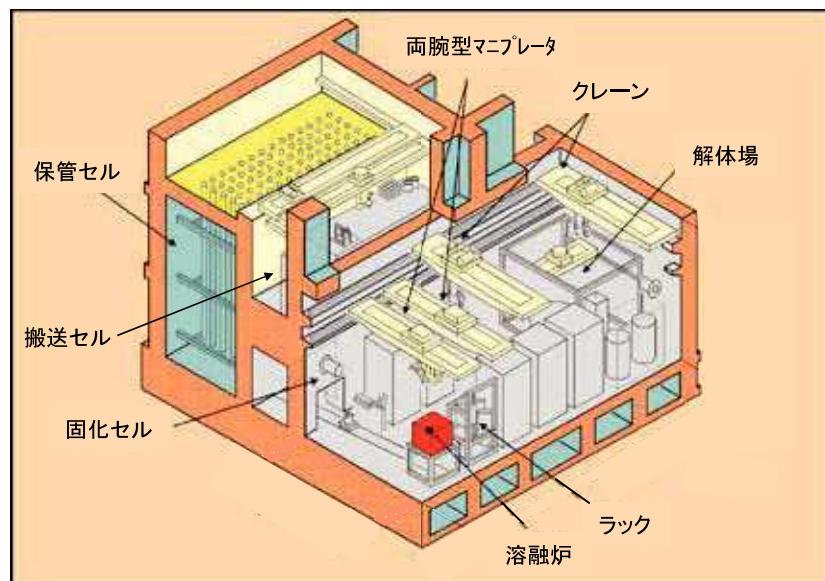

固化セル周り鳥瞰図

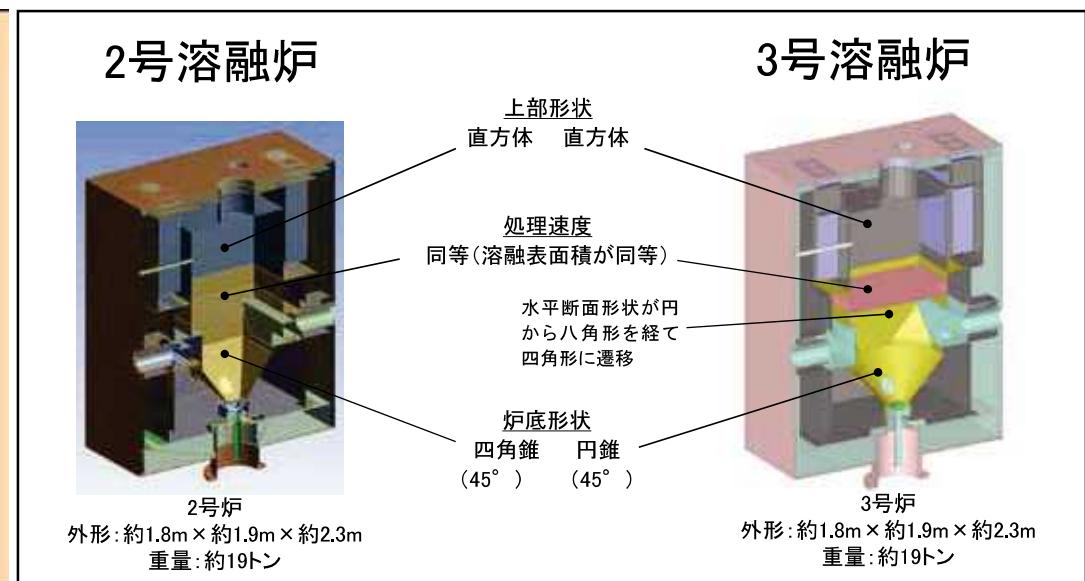

3号溶融炉の基本構造(2号溶融炉との比較) 34

④ 工程

リスクの早期低減のため、ガラス固化に要する期間を可能な限り短縮し、平成40年度までに高放射性廃液のガラス固化を進める。

- 設備機器の計画的更新や予備品対策により遅延リスクを低減。
- 計画的に停止期間を設け、溶融炉や遠隔保守設備の整備。
- 運転体制を強化し、連続運転期間の延長、停止中の整備作業を効率化。

既定条件説明 年度	年数 年度																	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度	H39年度	H40年度	H41年度	H42年度
(1) 運転・定期検査等	①ガラス固化処理			8本 (16-13本)	4本 (17-16本)	46本		50本		60本 ↑	70本 ↑			71本 ↑	80本 ↑	80本 ↑	80本 ↑	80本 ↑
	②定期検査点検・保守等																	
	③廃棄物解体・払出し				間接加熱・はつり装置1号、2号 BSM後回台等		間接加熱		固化セルクレーンの走行ケーブルリール				2号溶融炉					
(2) 施設整備	④ガラス除去							6か月		6か月 ↓	6か月 ↓			6か月 ↓	6か月 ↓	6か月 ↓	6か月 ↓	6か月 ↓
	⑤高経年化対策																	
	⑥遠隔機器整備																	
	運転体制 ⑦組織体制 保守体制																	
(3) 溶融炉開発・設置	⑧設計・製作																	
	(保管本数)																	
(4) 保管施設	⑨保管能力増強(TVF)																	
	⑩新規保管施設建設																	

現在

* : 見直し予定

① HASWS施設の概要

○HASWSには、ハル缶（使用済み燃料をせん断/溶解して残ったハル・エンドピースを収納）、フィルタ類（再処理主工程で使用）、分析廃棄物用容器（分析試料採取に用いた試料ピン等を収納）を貯蔵。

○貯蔵セルは、鉄筋コンクリート造(昭和47年8月竣工、耐震設計上分類：A類)

○廃棄物貯蔵方法


ハル貯蔵庫：ハル缶等をセル天井部の開口部からワイヤで吊降ろして投入し、ワイヤを接続したまま山積で貯蔵。

予備貯蔵庫・汚染機器類貯蔵庫

：分析廃棄物用容器を予備貯蔵庫および汚染機器類貯蔵庫のセル天井部の開口部から投入し、山積で貯蔵。

○湿式セル、乾式セルともに廃棄物を取出すための設備は無い。

○貯蔵庫の廃止措置には、プール水、緩衝砂の回収および除染が必要。

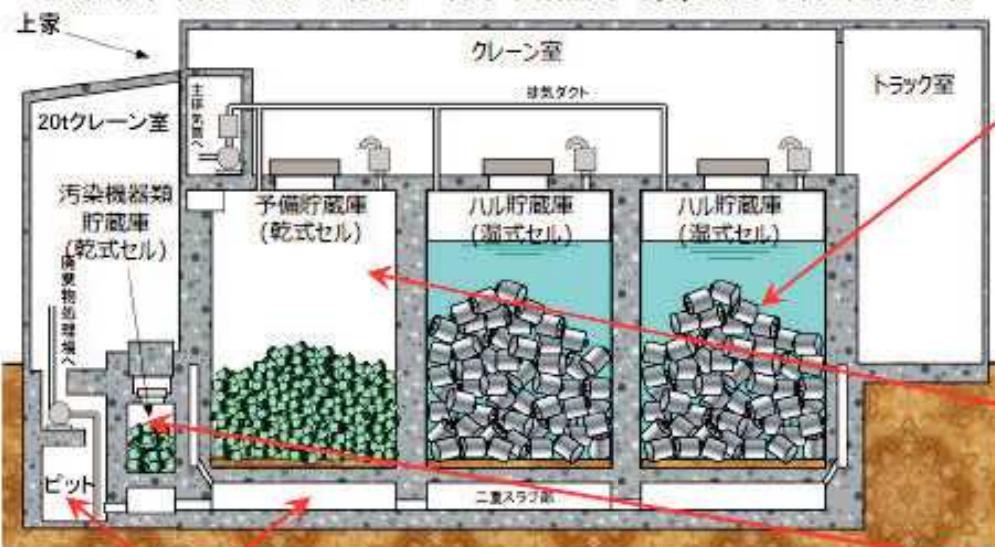

ハル貯蔵庫（2基）

- ・大きさ：縦7m × 横7m × 高さ10m
- ・底面及び壁面：ステンレス(SUS304L)のライニング
(厚さ：底面4mm、壁面3mm)
- ・底面に緩衝用の砂を敷設
(厚さ約0.6m : 約30m³)
- ・水位：約8.5m (プール水の浄化設備は有していない)
- ・廃棄物貯蔵高さ：約7m

予備貯蔵庫（1基）

- ・大きさ：縦7m × 横7m × 高さ10m
- ・壁面：エポキシ塗装
- ・底面：炭素鋼(SS41)のドリップトレイ
(高さ：0.3m、厚さ：4.5mm)
- ・緩衝用の砂を敷設
(厚さ約0.6m : 約30m³)
- ・廃棄物貯蔵高さ：約5m

汚染機器類貯蔵庫（7基）

- ・大きさ：縦2~3m × 横1.5m × 高さ3.4m
- ・底面及び壁面：エポキシ塗装
- ・底面に緩衝用の砂を敷設
(厚さ約0.6m : 約14m³)
- ・廃棄物貯蔵高さ：約3m

○漏えい水回収機能

- ・温式セルからの漏えい水は、二重スラブを通りピットへ集められる。
- ・ピットに集められた漏えい水は、ポンプにて廃棄物処理場へ送液する。

② HASWS施設のリスク

- HASWSでは、高放射性固体廃棄物(雑固体廃棄物、ハル・エンドピース等)を貯蔵及び分析所(CB)から発生する高放射性固体廃棄物(分析廃ジャグ等)の受入れ・貯蔵を行うため、施設を継続して使用しており、換気による負圧バランスを確保した上で、放射性物質の施設外への漏えい防止機能及び放射線遮蔽機能を維持することが必要。

✓ 高放射性固体廃棄物の取出し完了までのリスク評価結果

- ・貯蔵セルは、必要保有水平耐力の1.5倍以上(7.7倍)であり、十分な保有水平耐力を有する。
- ・貯蔵セルが損傷し、遮蔽機能を喪失した際の周辺公衆の実効線量は、5mSvより十分低く、 $0.36 \mu\text{Sv}/\text{h}$ ($3.2 \text{ mSv}/\text{年}$)である。
なお、十分な時間的余裕があるため、その間に線量を抑える対策(土のう設置)が可能であり、被ばく量を $0.017 \mu\text{Sv}/\text{h}$ ($0.15 \text{ mSv}/\text{年}$)に抑えることが可能。
- ・プール水喪失時における建家外の線量率は、管理区域の設定基準は超えない。
- ・乾式セルにて貯蔵している廃棄物の主材料であるポリエチレンと試薬(硝酸、ドデカン)の接触を評価した結果、自然発火の可能性はない。
- ・津波について、暫定津波シミュレーションの結果、ハル貯蔵庫及び予備貯蔵庫の浸水の可能性は低い。
- ・竜巻について、貯蔵セルの壁及び天井が十分な厚さを有していることから、廃棄物が建家外に流出するリスクは低い。

③ 現状及び今後の安全対策(1/3)


高放射性固体廃棄物保管に係る安全対策として以下を実施。

- 湿式セルライニングの健全性確認(外観観察、プール水の分析)
- プール水の漏えい対策(仮設循環ライン、ポンプ及び堰の整備)
- プール水の浄化(プール水の移送・給水による希釈法、吸着材による吸着法を検討)
- 乾式セルでの火災発生時の対策(散水装置、温度監視設備の整備)

仮設循環ライン、ポンプ及び堰の整備



資機材の配備状況

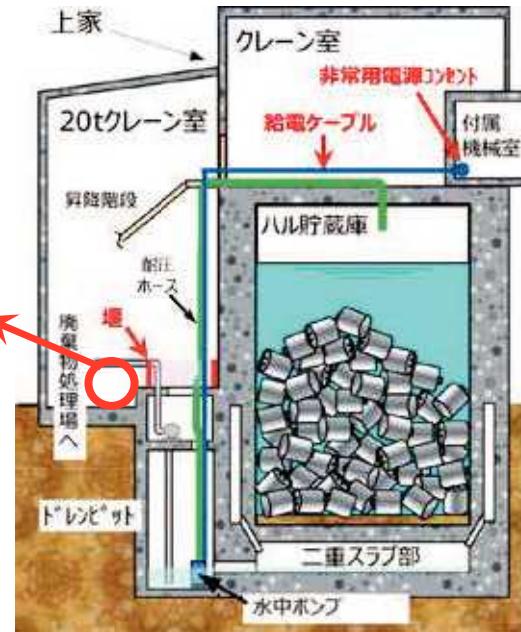


ポンプ設置・耐圧ホース敷設概要

散水装置を整備



散水装置

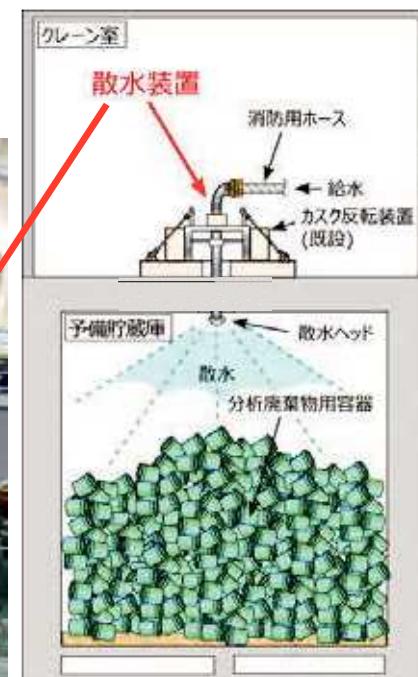


散水のイメージ

③ 現状及び今後の安全対策(2/3)

平成36年度の廃棄物取出開始目標に以下の取組みを進める。

- 廃棄物を取出すための遠隔装置を開発。
- 現在の貯蔵施設(HASWS)の上に取出し建家を新規設置。
- 取出した廃棄物を再貯蔵するための貯蔵施設(HWTF-1)を新規設置。

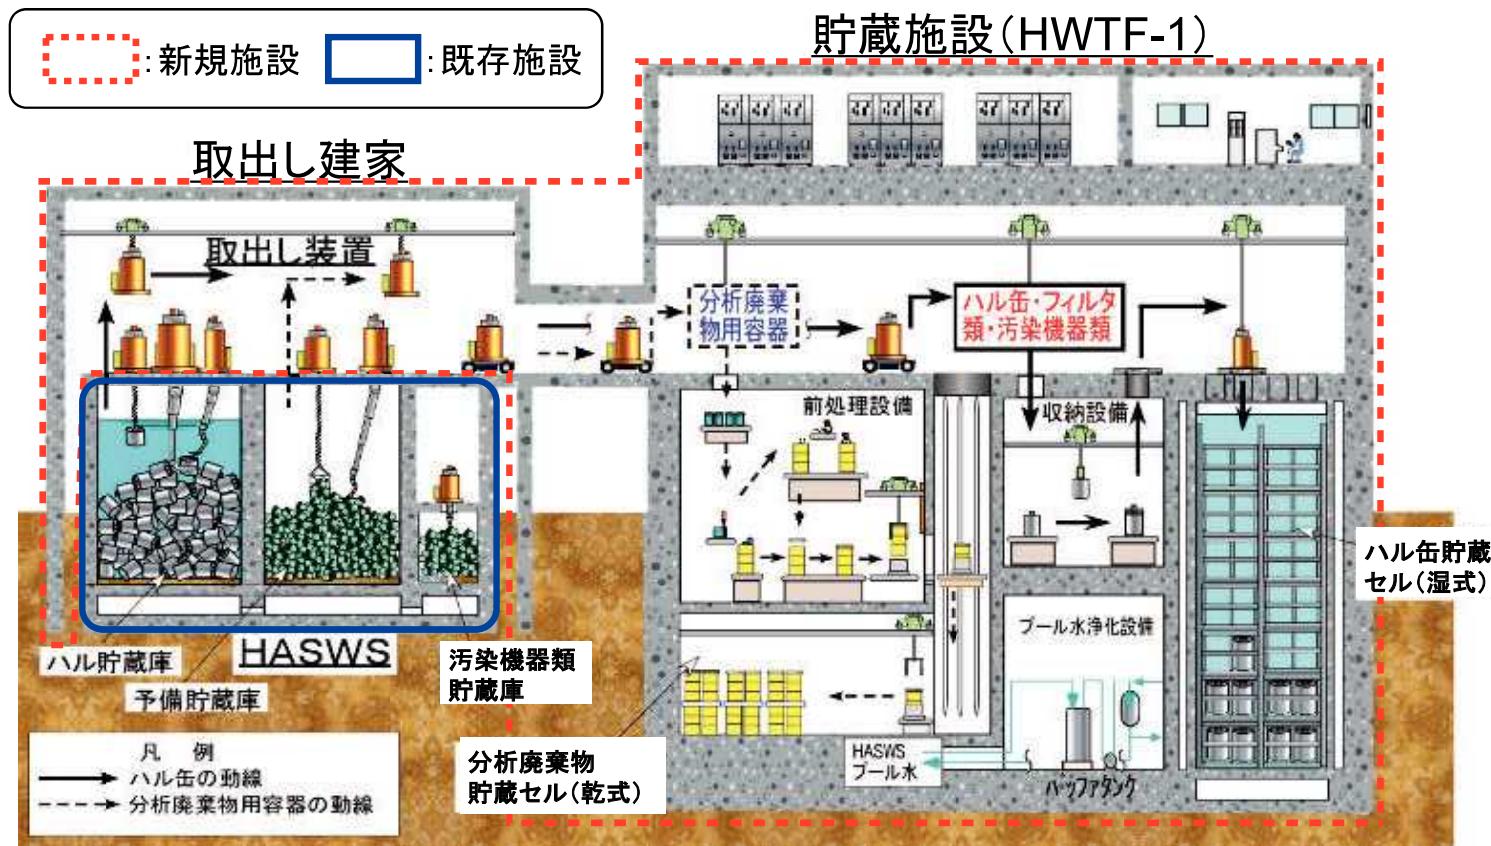

③ 現状及び今後の安全対策(3/3)

○取出し装置のモックアップ

➤ モックアップの目的

不規則な状態で貯蔵されているハル缶等を複数の取出し装置により短期間で確実に取り出せることを実証するために、実環境を模擬したモックアップを実施する。

➤ 取組状況

- ・平成25年度：モックアップ設備の概念検討
- ・平成26年度：モックアップ水槽の設計・製作、基礎施工
- ・平成27年度：モックアップ水槽の組み立て設置
- ・平成29年度～：モックアップ水槽のライニング溶接


➤ モックアップ設備の概要(完成後)

- ・構 造：床上自立型角型水槽(昇降床※付属)
※貯蔵高さを模擬するための設備
- ・材 質：ステンレス(SUS304)
- ・寸 法：幅 約7m × 奥行 約7m × 高さ 約10m
- ・最大貯水量：約230 m³


➤ モックアップ内容

モックアップ設備により、以下の確認を実施する。

- ・不規則な状態の個々の廃棄物に対する、装置の遠隔操作性の確認(アクセス、ハンドリング)
- ・複数装置の連携及び装置干渉の確認(制御システム含)
- ・取出し操作の習熟
- ・安全な取出し手順の確認

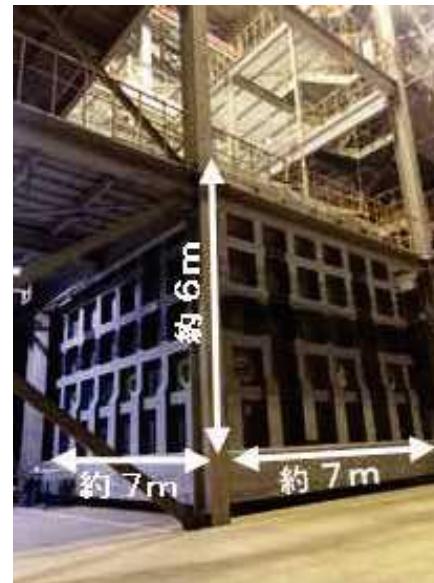

モックアップ設備の現状

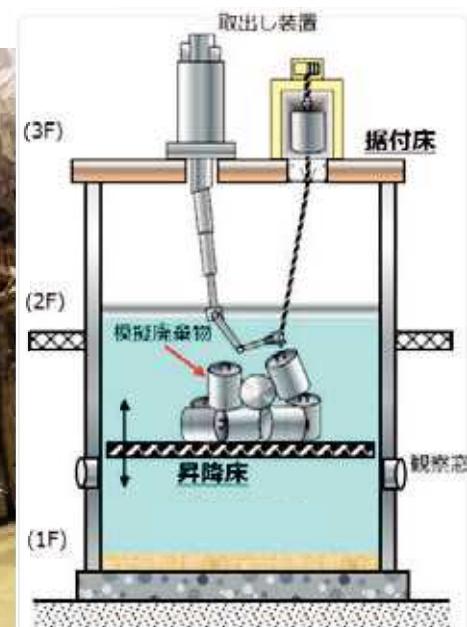

モックアップの概念図

① LWTF施設の概要

低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)は、再処理施設から発生する低放射性の液体及び固体廃棄物の減容処理を行う施設。

1.建家概要

【主要構造】：鉄筋コンクリート造(地下2階、地上5階)

【建築面積】：約2,400m²

【延床面積】：約15,000m²

【建設期間】：平成14年3月～平成18年9月

※低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)は、低放射性濃縮廃液等の処理方法を蒸発固化からセメント固化に変更する計画である。



2.建設の目的


- ・アスファルト固化に代わる廃液処理
- ・難燃物を含む固体廃棄物の焼却減容処理
- ・東海再処理施設内の貯蔵施設の満杯回避

3.主な処理対象廃棄物及び処理能力

処理対象廃棄物	処理能力
低放射性液体廃棄物 (濃縮廃液、リン酸廃液)	蒸発缶(2基)：約3 m ³ /日以上 蒸発缶(1基)：約0.3 m ³ /日以上
低放射性固体廃棄物 (可燃物・難燃物) 紙、布、塩化ビニル製品等	焼却炉(1基)：約400 kg/日以上

② LWTF施設の整備計画

- 再処理に伴い発生した大量の低放射性廃液の貯蔵の安全を確保するため、平成35年度の廃液処理開始を目指に低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)の整備を進める。
- 平成33年度の処理開始を目指に可燃性廃棄物(含塩素)の焼却設備の耐食性を改善するための材料変更を進める。

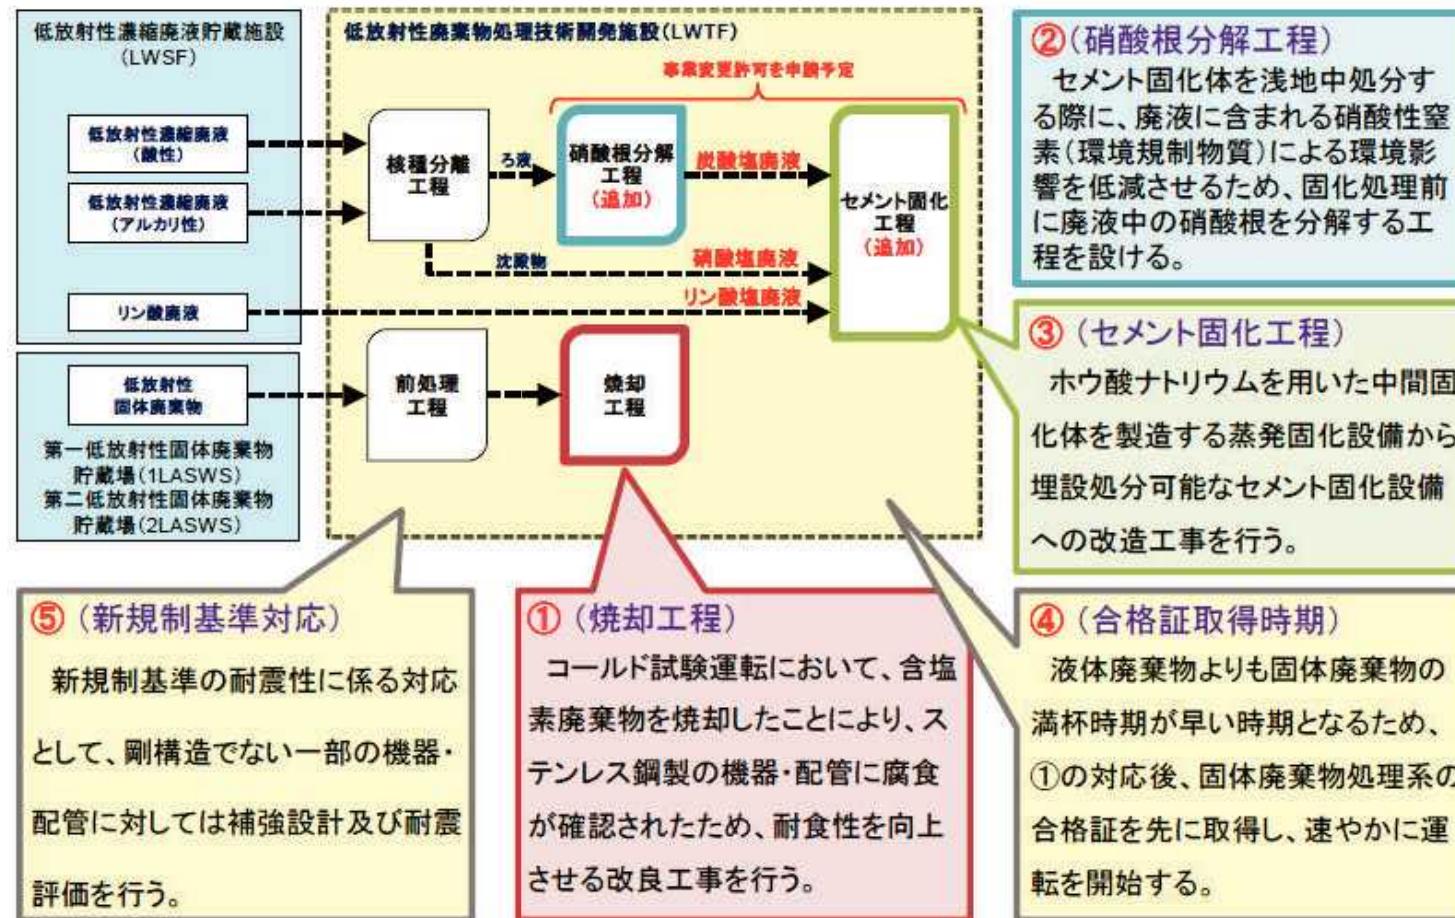

2.2 施設のリスク低減の取組 — 事故対処設備 —

緊急時対策所

: 設置済み

既存(T.P.+約6m)及び代替(T.P.+約26m)の緊急時対策所を整備・利用

新川

移動式発電機 (1000kVA)

可搬型発電機 (550kVA)

可搬型蒸気供給設備

ホイールローダ

油圧ショベル

既存(T.P.+約6m)及び代替(T.P.+約26m)の緊急時対策所を整備・利用

東海再処理施設 (T.P. +約6m)

核燃料サイクル工学研究所

ポンプ車(計4台配備)
大津波警報発令に伴い、
高台(T.P.+約18m以上)へ移動

高台(T.P.+約27m)

予備 移動式発電機 (分散配備)

燃料タンク

ローリー車

不整地運搬車

非常用発電機(7台)及び緊急用電源(2台)の7日分の燃料を確保

移動式発電機等の状況

緊急時対応資機材倉庫内の状況

主な訓練風景

緊急電源ケーブルの接続作業 (移動式発電機)

整地作業(ホイールローダ)

掘削作業(油圧ショベル)


— 新規制基準への対応方針 —

- 各施設の今後の使用計画を踏まえ、施設が保有する放射性物質によるリスクに応じて安全上の重要度を見直し、その重要度に応じ必要な安全対策を行う。
- 安全対策の設計を施設の現況等に照らし進めている段階であり、平成29年度末までの設計内容を踏まえて対策の可否を判断するとともに、安全対策の実施範囲及び実施内容を整理し、その後、廃止措置計画の変更申請を行う。
- 安全対策の詳細内容については、遅くとも平成31年度末までに定め、逐次廃止措置計画の変更申請を行う。その際、再処理維持基準規則により難い特別な事情があり、規則を踏まえた安全対策を実施できない場合については、必要に応じて可搬型設備等の代替策も視野に入れ、安全機能の維持や回復を検討する。

2.2 施設のリスク低減の取組

— 新規制基準を踏まえた安全対策の検討状況、今後の方針 —

平成33年度終了を目指しに新規制基準を踏まえた安全性向上対策を進める。

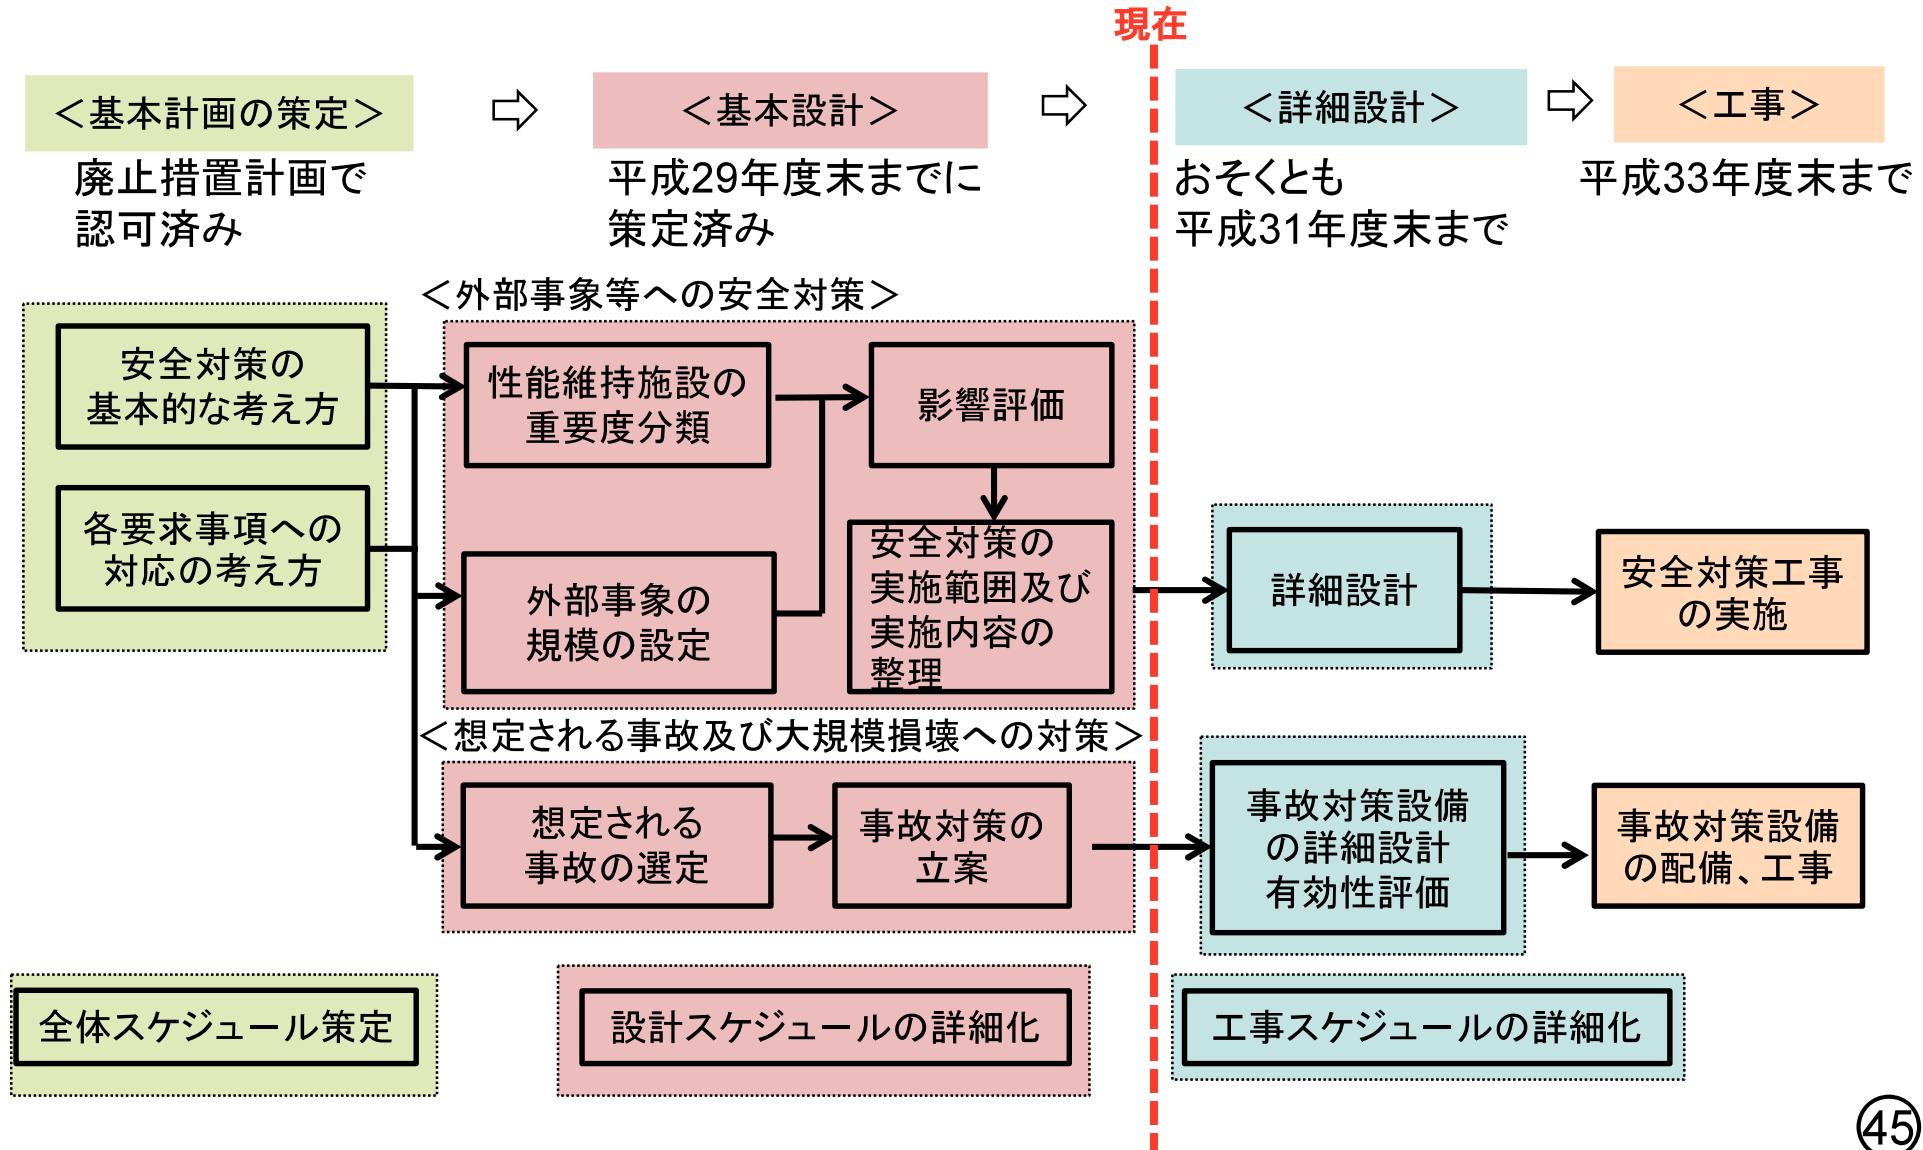

2.2 施設のリスク低減の取組 — 建家の耐震評価 —

耐震評価の流れ

基準地震動
の策定

- 基準地震動: 最大加速度952ガル
(東北地方太平洋沖地震時の観測波を基に解放基盤面にて推定した地震動の約2倍)
- 建家・構築物(支持地盤を含む)の耐震性
 - 周辺地盤の改良により、HAW建家は基準地震動に対する耐震性を確保できる見通し。
 - TVF開発棟については、基準地震動に対する耐震性を確保できる見通し。
- HAW建家、TVF開発棟の主要設備については基準地震動に対する耐震性を確保できる見通し。
- 配管系の一部等については、耐震対策工事として補強を行うことで耐震性を確保できる見通し。

評価用地震動の作成
(床応答スペクトル)

機器・配管類
耐震評価
(必要に応じ補強設計)

2.2 施設のリスク低減の取組 — 津波対策 —

- ▶ 基準津波によるHAW建家、TVF開発棟に対する津波高さは、津波と高潮との重畳を考慮した場合でもT.P.+14.2m、T.P.+12.8mと評価され、津波防止扉等による浸水防止措置の高さ(14.4m)を下回っている。

浸水防止扉(設置済み)




T.P.+14.4m

T.P.+14.2m

(基準津波による津波高さ)

T.P.+約6m


高放射性廃液貯蔵場

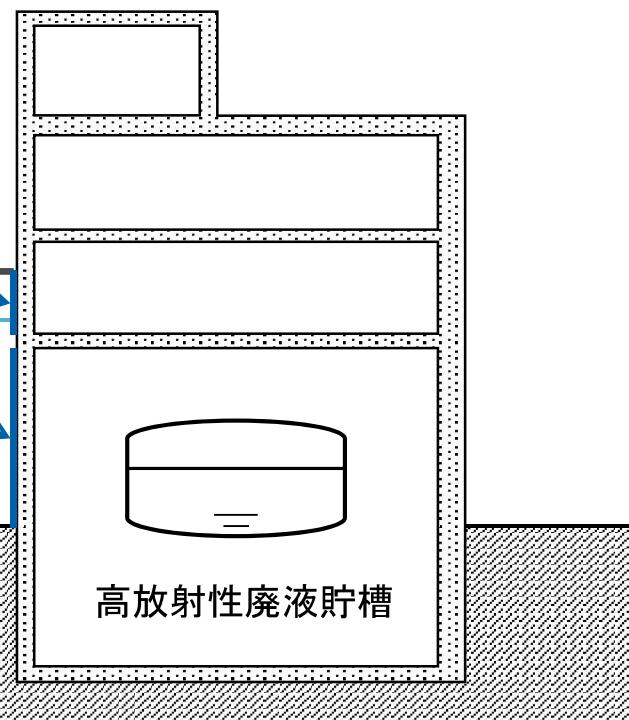

2.2 施設のリスク低減の取組 — その他の自然災害対策(竜巻) —

竜巻条件（竜巻影響評価ガイド記載値）

想定竜巻	100m/s
想定する竜巻飛来物	鋼製材
飛来物速度	水平：51m/s (時速約180km) 鉛直：34m/s (時速約120km)



- 想定される竜巻の風荷重や竜巻飛来物の衝撃に対し、3次元解析評価※の結果等から、HAW施設の建家コンクリート躯体は健全な見通し。
- 窓・扉等の開口部は鋼板等により竜巻飛来物から防護することを検討
- 万一、竜巻の影響により重要機器が損傷した場合に備え、ポンプ車、移動式発電機等の可搬型の代替設備を配備。

※衝突解析コードAUTODYNによる評価であり、衝撃や爆発、高圧現象のような短時間に過大な荷重が作用する材料の挙動を解析することが可能。なお、本解析コードは原子力施設への航空機衝突に対する安全研究や水素爆発に対する安全研究などに広く用いられており、原子力発電所の重大事故対策（水蒸気爆発対策）の有効性確認の審査で使用されている。

凡例

- ・緑色：健全な箇所
- ・赤色：ひび割れ箇所

竜巻飛来物（鋼製材）


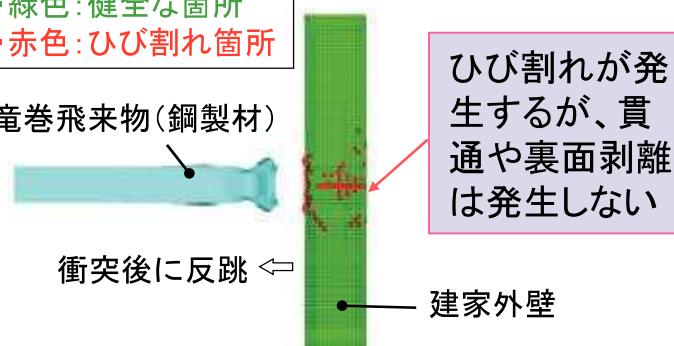


図1 HAW施設の建家外壁に対する3次元解析結果

扉の防護例



窓・ガラリの防護例





図2 窓・扉等の開口部の防護(HAW施設への実施イメージ)

2.2 施設のリスク低減の取組 — 当面の工程 —

再処理施設全体の安全対策と並行して、TVF保管能力増強、LWTF設備改造等を実施する必要があり、それぞれの工事時期が異なることから、それぞれの廃止措置計画変更に係る申請を並行して実施する必要がある。

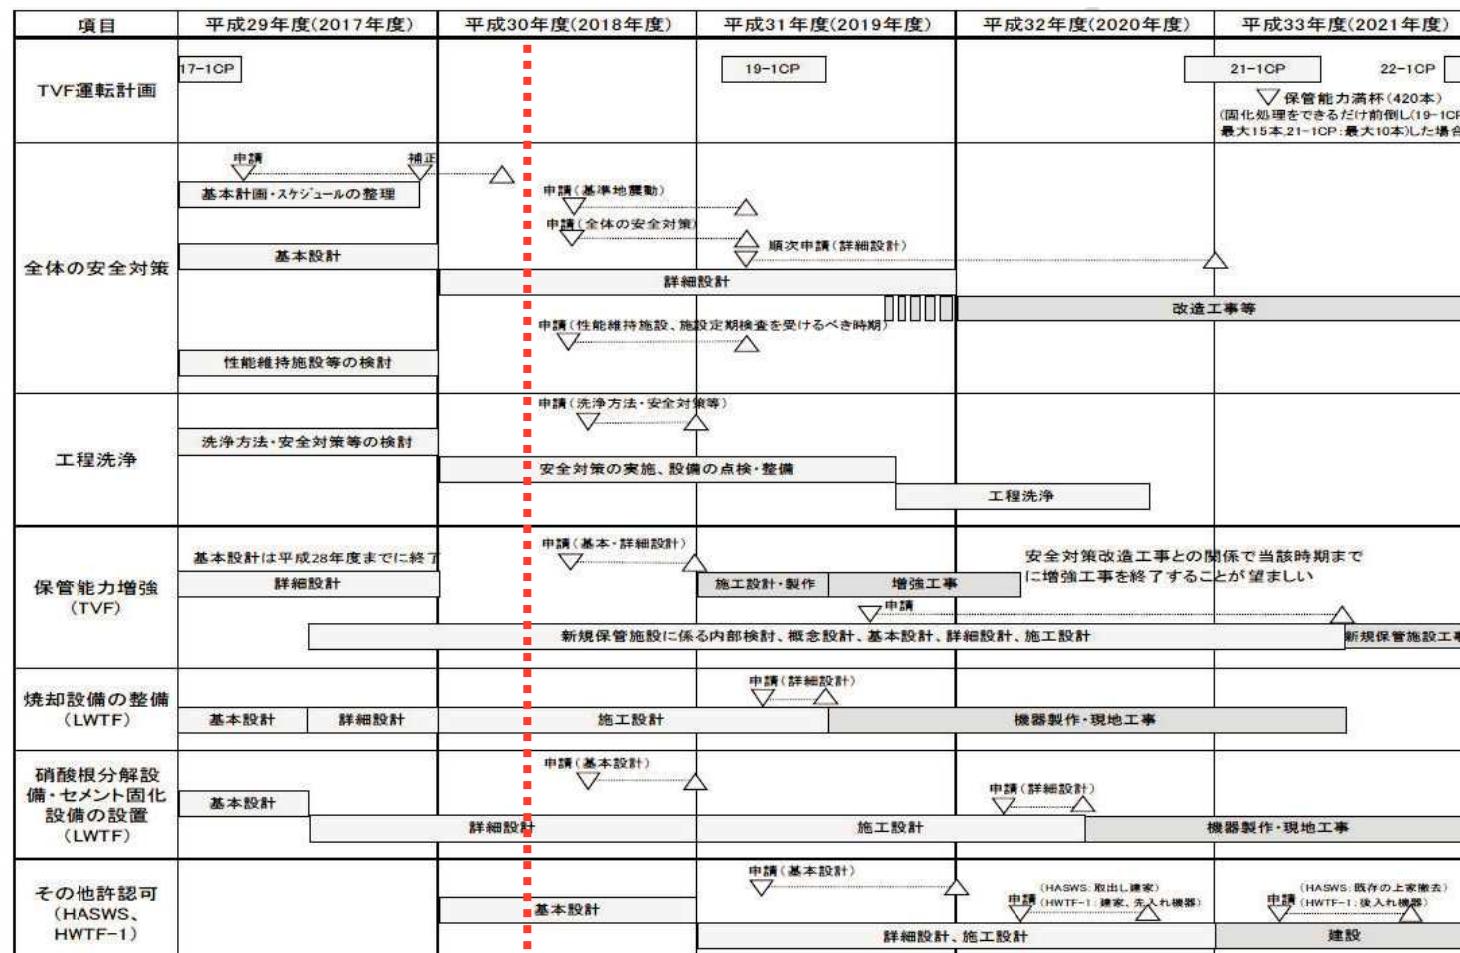

現在

△ : 当該時期までに認可が得られないと後工程に影響が発生
本資料は進捗等に応じて適宜見直す
