いばらき木づかいチャレンジ事業を活用した保育園施設
(ラ・フェリーチェ保育園)の完成について

1 事業の概要

(1) 事 業 名　　令和７年度(繰越)いばらき木づかいチャレンジ事業(木造化・木質化支援)

(2) 事業主体　　特定非営利活動法人つくばハーモニー　理事長　齋藤　隆

(3) 所 在 地　　茨城県つくば市面野井字愛宕８３８番１

(4) 事 業 費　　132,800,000円 （県補助金 10,000,000円）

2 施設の特徴

・当施設は少人数による保育の意義を評価し、家のような居心地の良い環境づくりを目指す保育園で、０歳から２歳児は小規模認可園(南棟)、３歳から５歳児は認可外保育事業(北棟)であるため適度な距離感のある平面計画であると同時に、全体としては一体感のある建物としている。

・各事業所にある程度の独立性を担保するため、デッキを挟んで北棟と南棟を配置し、別棟デッキ部分の屋根は重なりを小さくし、屋根の下に柱の要らない経済的な方杖形式とした。


・スギ板張り以外の外壁には、セメント板やサイディングを使用したが、ジョイント部分には、ふだん使われない枝付き板やチップになってしまう背板材を目板として使用した。

○　参　考

・延 床 面 積　　２４３．４６㎡

・県産材使用量　83.02㎥うち地域材61.14㎥ （産地は常陸大宮市、大子町、高萩市 他）

・工 事 期 間　　令和７年10月17日～令和８年８月20日

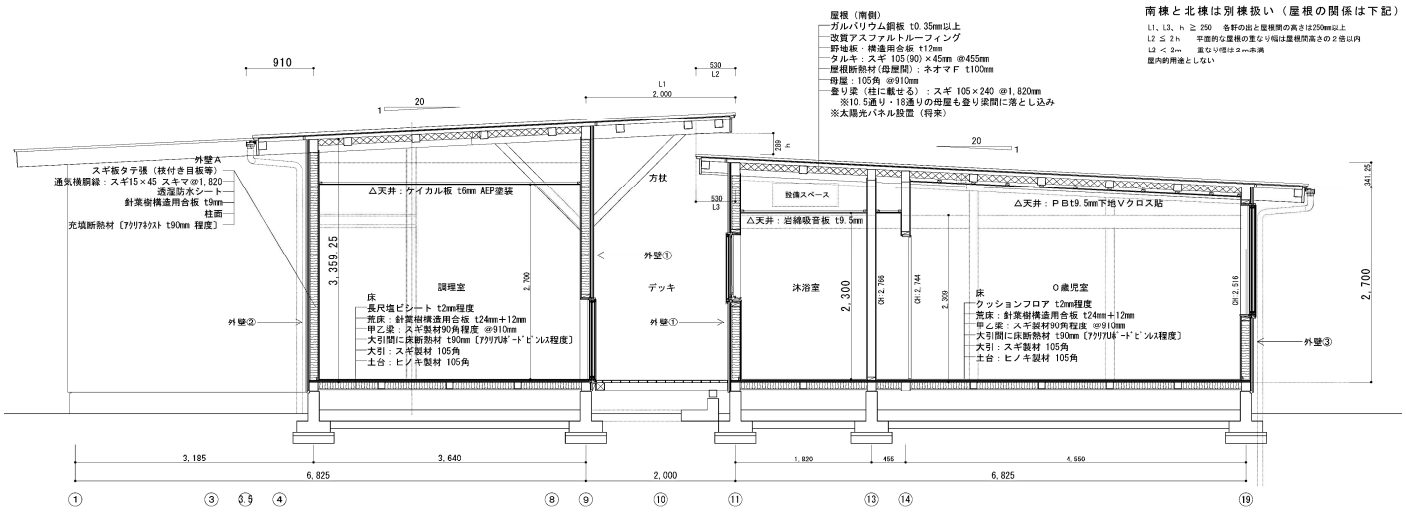

設計図（断面図）



正　面　外　観



外観（背板材、枝付き板）



外観（軒天状況）



デッキ（スギ赤身材使用）



室内の様子



建て方の木材使用状況
